

농림축산국

제380회 임시회
2025. 7. 15. ~ 7. 23.

*

산림복지과

목 차


I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	7
1. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업	7
2. 삼형제저수지 둘레길 조성사업	9
3. 맹동저수지 둘레길 조성사업	11
4. 국산목재 목조건축 실연사업	13
5. 도시바람길숲 조성사업	15
6. 맨발숲길 · 황톳길 조성사업	17
7. 맹동 치유의 숲 조성사업	19
8. 백야자연휴양림 보완사업	21

1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 5팀

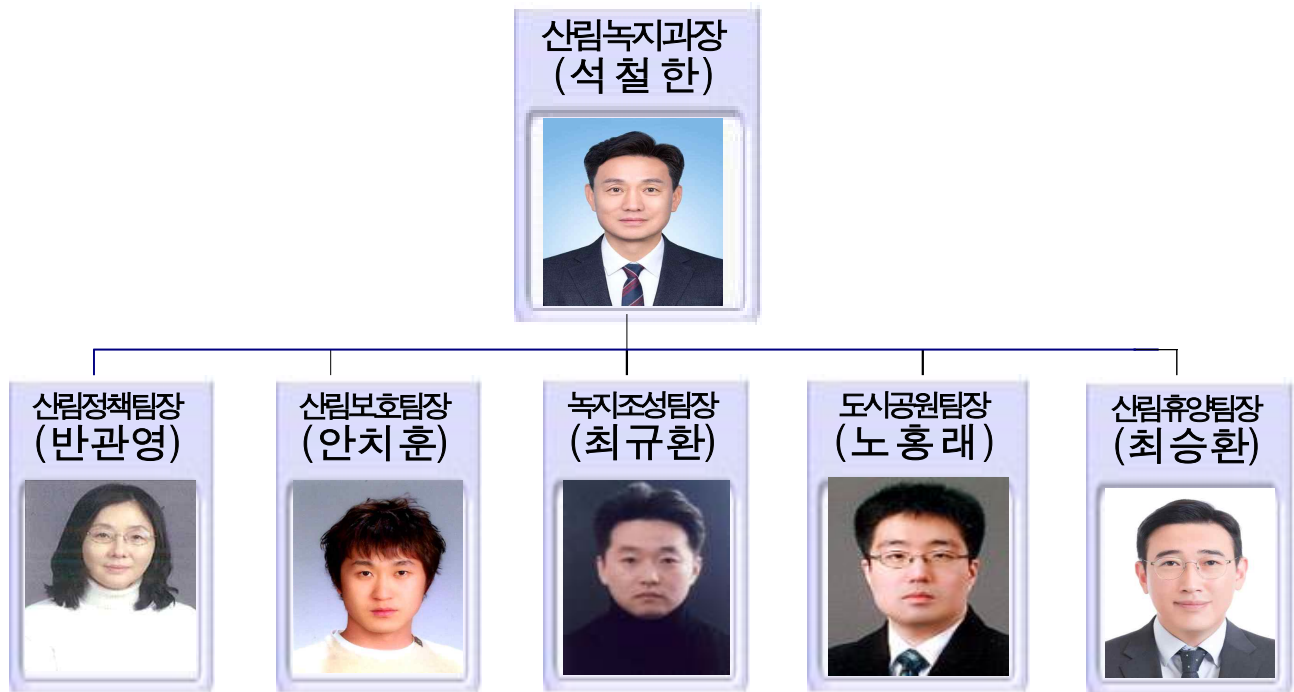

□ 인 력: 정원 25명 / 현원 24명

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	36	24		1	5	7	9	2	4	8
산림정책팀	6	6		1	1	1	2	1		
산림보호팀	8	5			1	2	2			3
녹지조성팀	5	3			1	1	1			2
도시공원팀	4	3			1	1		1		1
산림휴양팀	13	7			1	2	4		4	2

※ 정원의 인력: 공무원 5명/ 청원경찰 1명/ 청원산림보호직원 3명/ 임기제 3명

2

주요기능

산림정책팀

- ❖ 조림 및 숲 가꾸기 사업
- ❖ 산지전용허가, 협의, 신고

산림보호팀

- ❖ 산불방지대책 추진 및 산림병해충 방제
- ❖ 임도시설 사업 및 군유림 업무 추진

녹지조성팀

- ❖ 도시숲 조성 및 유지관리
- ❖ 봉학골정원 및 산림레포츠 조성·관리

도시공원팀

- ❖ 공원 관리 및 산업단지 녹지대 관리
- ❖ 혁신도시공원 관리 및 산림공원 조성·관리

산림휴양팀

- ❖ 산림휴양시설 조성·관리
- ❖ 치유의 숲 조성 및 목재문화체험장 운영

3

예산규모

□ 일반회계: 24,377백만원(군 예산의 2.65%)

(단위:백만원)

구 분	2025년 2회 추경	2024년 2회 추경	증 감(%)	
계	24,371	25,401	△1,030	(△4%)
산 립 정 책 팀	4,070	6,502	△2,432	(37%)
산 립 보 호 팀	4,220	4,389	△169	(△4%)
녹 지 조 성 팀	6,319	5,288	1,031	(19%)
도 시 공 원 팀	5,891	4,696	1,195	(25%)
산 립 휴 양 팀	3,834	4,488	△654	(14%)
행 정 운 영 경 비	37	38	△1	(3%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 산림녹지과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
조림 및 숲가꾸기 사업	- 조림사업 146ha - 숲가꾸기 사업 980ha	2,720	· 조림사업(춘기경제림조성, 큰나무조림) 완료(97.8ha) · 조림지사후관리(풀베기) 실시 (1회베기 완료, 341.5ha) · 공익림가꾸기 사업완료(30ha) · 산불예방숲가꾸기 대상지 확보(25m) · 덩굴제거사업 실시설계용역 완료(20ha)	46
선도 산림경영단지 조성사업	- 산주들을 대신해 산림을 경영하고 이로 인해 발생하는 수익을 산주들에게 환원해주는 사업	778	· 2025년 4회차 선도 산림경영단지 조림 준공(25.03.) · 선도 산림경영단지 임도 조성공사 착공(25.05.) · 선도 산림경영단지 숲가꾸기 사업 설계 및 착수(25.05.~06.)	40
산불예방대책 추진	- 산불소화시설 유지보수 - 산불감시 진화인력 사역 - 산불진화차 대체구입	2,221	· 백야자연휴양림, 수레의산 자연휴양림 산불소화시설 유지보수 · 산불감시 진화인력 사역 · 입산통제 및 산불조심 입간판 정비 및 재설치 · 산불위험도알리미 2대 설치	70
임도조성관리	- 간선임도 신설 및 임도 유지보수 사업 시행	901	· 간선임도 신설공사 착공 (25. 6. ~ 12.) · 임도보수사업(갑산~중동) 준공 (25. 6.) · 임도구조개량(차곡임도) 공사 진행중(25. 6. ~ 7.)	60
봉학골 산림레포츠단지 조성사업	- 모험·체험시설 등 산림 레포츠시설 및 휴게시설	5,900	· 시설물 공사 발주(25.5.)	50
삼형제 저수지 둘레길 조성사업	- 무극저수지 둘레길 2차 조성사업 준공	9,000	· 무극저수지 둘레길 2차 준공 : L=0.33km	60
맹동저수지 둘레길 조성사업	- 맹동저수지 둘레길 2차 조성사업 준공	2,000	· 맹동저수지 둘레길 2차 준공 : L=0.90km	60
학교숲 조성사업	- 학교내 녹지공간 확충으로 쾌적한 교육 및 휴게공간 제공	60	· 실시설계 준공(25.2.) · 학교숲 조성사업 준공(25.6.)	95

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
쾌적한 도시경관 조성사업	- 꽃묘재배 등 꽃길조성, 가로수 및 도시경관 조성을 통한 녹색도시경관 창출 및 음성군 이미지 제고	1,518	· 버즘나무 가로수 전정작업(25.2.) · 봄꽃 9개읍면 배부(25.3.) · 은행나무 가로수 전정작업(25.3.) · 여름꽃 9개읍면 배부(25.6.) · 상반기 가로수 민원처리(25.1.~6.)	50
맨발숲길·황톳길 조성사업	- 군민 생활권 및 관광지 주변에 맨발숲길, 황톳길 조성으로 휴식 공간 제공 및 이용객 건강증진 기여	780	· 충북혁신도시 남천공원 맨발숲길 조성사업 추진(25.6.~11.) · 맹동 치유의숲 맨발숲길 추진(10월준공) · 봉학골산림욕장,백야자연휴양림 내 맨발숲길 조성(25.7.~11.) · 대소 망가래공원 황톳길조성 예산 재배정	30
도시공원 및 녹지대 유지관리 사업	- 관내 공원 및 녹지대의 체계적인 유지관리로 쾌적한 녹색환경 조성	1,293	· 공원 및 녹지 유지관리사업 실시설계 용역 시행 · 예초 1회(총 3회 실시), 제초 1회, 관목전정 1회 실시	40
도시바람길숲 조성사업	- 바람생성숲, 연결숲, 디딤 확산숲으로 이어지는 바람길숲 조성으로 도심 열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등 정주여건 개선	10,000	· 제2차 전문가 자문회의(25.1.) · 기본 및 실시설계 용역 중간보고회(25.3.) · 주민설명회 개최(25.3.)	15
맹동 치유의 숲 조성사업	- 산림치유문화센터, 치유숲길,치유정원 등을 조성하여 군민들에게 산림치유와 여가공간을 제공하고 건강증진 기여	5,500	· 전망데크 준공(25. 4.) · 건축, 통신, 전기 공사 준공(25. 7.) · 토목공사 준공 예정(25. 10.)	85
백야자연휴양림 보완사업	- 노후 숙박시설(9동) 외부 리모델링을 통한 휴양림 이용객 만족도 및 이용률 증대	1,000	· 실시설계용역 준공(25. 5.) · 일상감사 및 계약심사(25. 6.) · 공사 착공(25. 7.) · 공사 준공 예정(25. 9.)	10
국산목재 목조건축 실연사업	- 국산목재 및 EITFE를 이용한 온실(식물원) 신축	13,000	· 건축기획 업무용역 착공(25.2.)	10

III. 주요 현안 사업

1. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업

- ◆ 위 치: 음성읍 용산리 580-8번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 11. ~ 2026. 5.
- ◆ 규 모: 산림레포츠단지 조성 1식
- ◆ 총사업비: 5,900백만원 (균특이양 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 모험·체험시설 등 산림레포츠시설 및 휴게시설
- ◆ 공정률(이행률): 50% ◆ 완료시기: 2026. 5.

□ 추진상황

- 산림레포츠단지 기본계획 수립용역 20. 11. ~ 21. 7.
- 산림레포츠단지 기본설계용역 22. 3. ~ 22. 11.
- 산림레포츠단지 실시설계용역 22. 11. ~ 23. 12.
- 산림레포츠단지 조성사업 건축공사(관리사무소) 24. 4. ~ 24. 12.
- 산림레포츠단지 조성사업 시설물공사 발주 25. 5.

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 산림레포츠단지 조성사업 입찰공고 및 계약 25. 7.
- 산림레포츠단지 조성사업 착공 및 준공 25. 7. ~ 26. 5.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	5,900	4,000	1,000	900	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	3,770	2,535	650	585	-
군 비	2,130	1,465	350	315	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



2. 삼형제저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 백야리·사정리·육령리 저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 11.
- ◆ 규 모: 둘레길 조성 1식(용계 4.8km, 무극 2.1km, 금석 1.8km, 이음길 1.6km)
- ◆ 총사업비: 9,000백만원 (도 33%, 군 67%)
- ◆ 사업내용: 둘레길·숲길 조성 및 데크설치·정비, 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 60% ◆ 완료시기: 2026. 11.

□ 추진상황

- 용계저수지 둘레길 최종 완료 23. 12.
- 금석저수지 둘레길 및 삼형제이음길 기본계획 수립 24. 1.
- 무극저수지 둘레길 1차 조성사업 준공 24. 5.
- 무극저수지 둘레길 2차 조성사업 준공 25. 4.

□ 향후계획

- 1. 용계저수지: 최종 완료
- 2. 무극저수지
 - 무극저수지 둘레길 3차 조성사업 착공 및 준공 25. 7. ~ 11.
 - 무극저수지 둘레길 4차 조성사업 착공 및 준공 26. 2. ~ 6.
- 3. 금석저수지
 - 금석저수지 둘레길 1·2차 조성사업 준공 26. 7. ~ 11.
- 4. 삼형제 이음길
 - 삼형제이음길 조성사업 착공 및 준공 26. 7. ~ 11.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	9,000	1,700	1,000	3,300	-
국 비					
도 비	3,000	3,000			
군 비	6,000	1,700	1,000	3,300	-
민 간					

부서/팀	산림복지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 계 획 도



3. 맹동저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동면 맹동저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 10.
- ◆ 규 모: 둘레길 조성 1식(L=2.31km)
- ◆ 총사업비: 2,000백만원 (군 100%)
- ◆ 사업내용: 둘레길 · 숲길 조성 및 데크설치 · 정비, 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 60% ◆ 완료시기: 2025. 10.

□ 추진상황

- 둘레길 조성사업 실시설계 및 사전절차 이행 23. 10.
- 맹동저수지 둘레길 1차 조성사업 준공 24. 6.
- 맹동저수지 둘레길 2차 조성사업 준공 25. 4.

□ 문제점 및 대책

- 사유지 2필지 토지사용 불허
 ⇒ 수변 우회노선을 통해 둘레길 조성 가능

□ 향후계획

- 맹동저수지 둘레길 3차 조성사업 착공 및 준공 25. 7. ~ 10.
- 맹동저수지 둘레길 조성사업 최종완료 25. 10.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	2,000	1,000	1,000	-	-
국 비					
도 비					
군 비	2,000	1,000	1,000	-	-
민 간					


부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 계 획 도

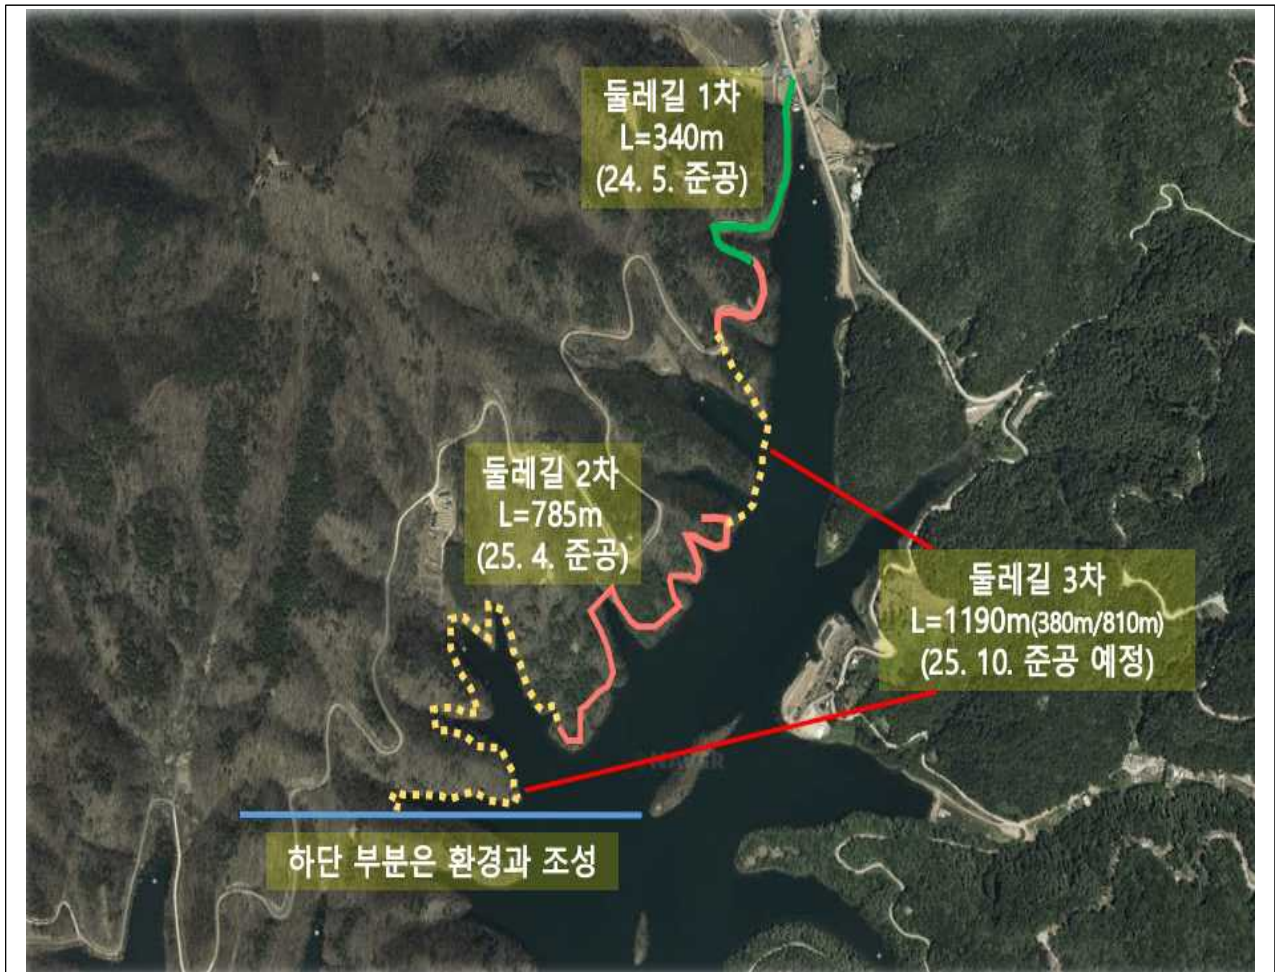

□ 현장 사진

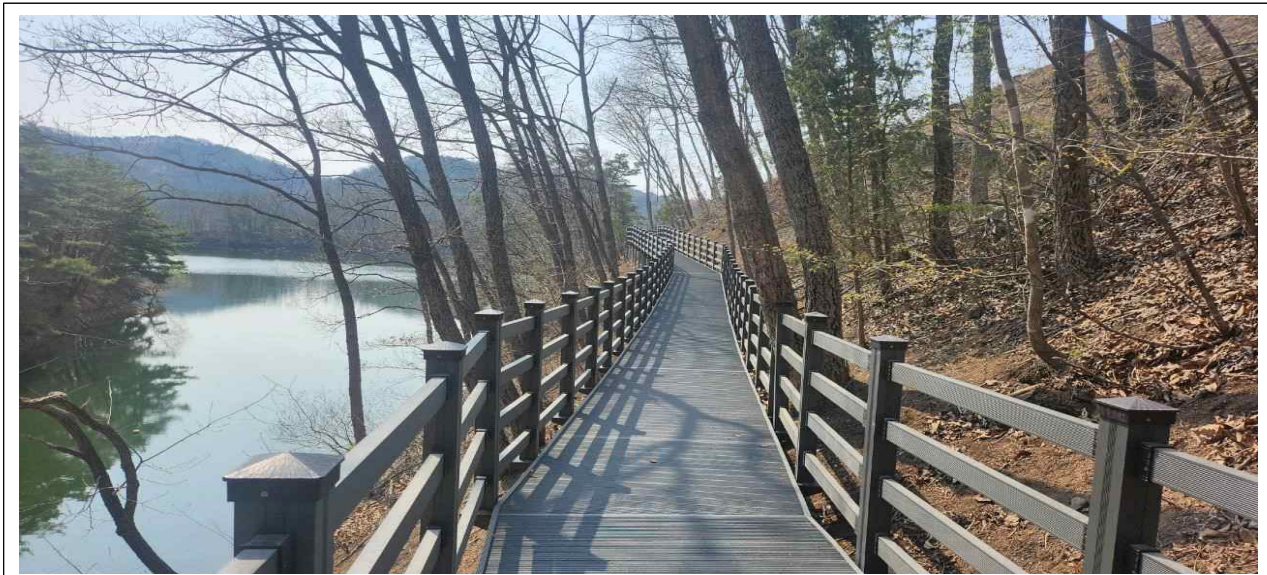

4. 국산목재 목조건축 실연사업

- ◆ 위 치 : 충북 음성군 음성읍 용산리 580-8 봉학골지방정원 내
- ◆ 사업기간 : 2025 ~ 2028(4년간)
- ◆ 규 모 : 3,000㎡
- ◆ 총사업비 : 13,000백만원 (지특 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용 : 국산목재 및 ETFE*를 이용한 온실(식물원) 신축
* ETFE: 플로로카본 중합체로 일광 투사율이 높은 초경량 친환경 자재
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2028. 12.

□ 추진상황

- 기본구상 및 기본계획(타당성조사)용역 24. 5. ~ 24. 9.
- 지방재정투자심사 24. 9.
- 중기지방재정계획 및 공유재산 관리계획 수립 24. 11.
- 건축기획 업무용역 착공 25. 2.

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 사업계획 사전검토 및 공공건축심의위원회 25. 7. ~ 25. 8.
- 설계공모 공고 및 심사 25. 9.
- 기본 및 실시설계 등 사업추진 25. 10. ~ 28. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	13,000	-	500	500	12,000
국 비	6,500	-	250	250	6,000
도 비	1,950	-	75	75	1,800
군 비	4,550	-	175	175	4,200
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지7급 추교연	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



5. 도시바람길숲 조성사업

- ◆ 위 치: 충북혁신도시 일원(맹동면)
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2027.
- ◆ 규 모: 생성(보완)숲 33,333㎡, 연결숲 11.2km, 디딤·확산숲 77,307㎡
- ◆ 총사업비: 10,000백만원 (균특 50%, 도 15%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: ①바람생성숲(외곽산림)→②연결숲(가로숲,수변숲)→③디딤 확산숲으로 이어지는 바람길숲 조성으로 도시 열섬현상 완화와 미세먼지 발생을 최소화하여 정주여건 개선
- ◆ 공정률(이행률): 15% ◆ 완료시기: 2027. 12.

□ 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 착공 24. 6. 10.
- 전문가 자문회의 1차 개최 24. 11. 7.
- 전문가 자문회의 2차 개최 25. 1. 21.
- 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 25. 3. 7.
- 주민설명회 개최 25. 3. 20.

□ 향후계획

- 전문가 자문회의 3차 개최 25. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 및 준공 25. 8.
- 도시바람길숲 조성사업 착공 및 사업추진 25. 10. ~ 27. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	10,000	500	3,000	3,500	3,000
균 특	5,000	250	1,500	1,750	1,500
도 비	1,500	75	450	525	450
군 비	3,500	175	1,050	1,225	1,050
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 도시공원팀	담당자	녹지7급 안종민	전화번호	871-3782
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



6. 맨발숲길 · 황톳길 조성사업

- ◆ 위 치: 봉학골 산림욕장 외 8개소
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 1,589백만원
- ◆ 사업내용: 맨발숲길 · 황톳길 조성, 세족장, 그늘막 쉼터 등
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2026. 11.

☐ 추진상황

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ○ 도·군 주민참여예산 신청 및 선정 | 24. 9. ~ 10. |
| - 혁신도시 남천공원, 봉학골 산림욕장, 대소 망가래공원 | |
| ○ 추가 대상지 자체예산 신청 및 확정 | 24. 10. ~12. |
| - 백야자연휴양림 내 | |
| ○ 주민참여예산(읍·면공모) 재배정(대소면) | 25. 1. |
| - 대소 망가래공원 | |
| ○ 실시설계 용역 실시(혁신도시 남천공원) | 25. 1. ~ 3. |
| ○ 맨발숲길 조성사업 착공(혁신도시 남천공원) | 25. 6. ~ 11. |

□ 향후계획

- 군 주민참여예산 미선정 대상지 3회 추경 예산 신청 25. 7.
 - 음성 남천공원, 양덕저수지 생태공원
- 26년 혁신도시 내 도 주민참여예산 사업대상지 신청 25. 7. ~ 8.
 - 혁신도시 참샘골공원 내 맨발숲길
- 26년 예산(군특이양) 신청 25. 8.
 - 수정산 산림공원 조성사업

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,589	9	780	800	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	210	-	120	90	-
군 비	1,379	9	660	710	-
미 가	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 도시공원팀	담당자	녹지6급 노홍래	전화번호	871-3781
------	---------------	-----	----------	------	----------

□ 조성계획도[혁신도시 남천공원]



[참고자료] 맨발숲길 · 황톳길 조성사업 현황

구분	대상지	노선길이	사업비 (천원)	방식	비고
합계	9개소	1,622m	1,580,000		
25년 추진	봉학골 산림욕장	100m	150,000	황토	설계 진행중
	백야자연휴양림	150m	200,000	황토	설계 진행중
	혁신도시 남천공원	172m	300,000	황토/맨발	6월 착공
	치유의 숲	250m	50,000	맨발	10월 준공
	대소 망가래공원	200m	80,000	황토	대소면 재배정
	소계	872m	780,000		
26년 예정	수정산 공원	100m	100,000	황토	산림공원 조성사업 (균특이양) 예산 신청
	음성 남천공원	300m	200,000	맨발	25년 3회 추경
	혁신도시 참샘골 공원	200m	300,000	황토	26년 도 주민참여예산
	양덕저수지 생태공원	150m	200,000	황토	25년 3회 추경
	소계	750m	800,000		

7. 맹동 치유의 숲 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동면 통동리 산37-1 일원
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 60ha
- ◆ 총사업비: 5,500백만원 (도 65%, 군 35%)
- ◆ 사업내용: 산림치유문화센터, 치유숲길, 치유정원, 전망대 등 조성
- ◆ 공정률(이행률): 85 % ◆ 완료시기: 2025. 10.

□ 추진상황

- 기본설계용역 20. 4. ~ 10.
- 치유프로그램 개발, 타당성 평가 20. 6. ~ 12.
- 실시설계 용역준공 및 도 계약심사완료 21. 4. ~ 23. 3.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 21. 7. ~ 22. 12.
- 공사착공 23. 4. ~
- 토목공사(1차분-건축부지) 준공 24. 5.
- 건축, 전기, 통신공사 준공 24. 3. ~ 25. 7.
- 토목공사(2차분-숲길조성 등) 준공 24. 6. ~ 25. 10.

□ 문제점 및 대책

- 노선변경(능선→수변)으로 인해 안전울타리 설치 필요
⇒ 예산확보 후 설치 검토

□ 향후계획

- 토목 준공, 준공식 및 견기대회 25. 10.
- 산림치유센터 오픈 및 프로그램 운영 26. 3.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	5,500	3,250	2,250		
국 비	-	-	-	-	-
도 비	3,251	2,113	1,138	-	-
군 비	2,249	1,137	1,112	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 / 산림휴양팀	담당자	녹지8급 이양희	전화번호	871-3764
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



- ◆ 위 치: 금왕읍 백야리 139-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2025.
- ◆ 규 모: 보완공사 1식 (숙박시설 9동)
- ◆ 총사업비: 1,000백만원 (도 75%, 군 25%)
- ◆ 사업내용: 노후화된 숙박시설을 개량공사하여 쾌적하고 안전한 휴양 시설 운영을 통해 휴양림 이용객 만족도 및 이용률 증대
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2025. 9.

○ 실시설계용역	25. 4. ~ 5.
○ 일상감사 및 계약심사	25. 6.

벽체 부식 및 틀어짐	예시) 조령산자연휴양림 숲속의집(징크마감)

○ 사업 착공 25. 7.

○ 사업 준공 25. 9.

재원별	총사업비	기투자	2025확보	2026요구	2027이후
합 계	1,000	-	1,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	750	-	750	-	-
군 비	250	-	250	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 산림휴양팀	담당자	행정7급 양희철	전화번호	871-3762
------	---------------	-----	----------	------	----------
