

경제산업국

제369회 임시회

2024. 7. 18. ~ 7. 26.

*

산림복지과

목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	8
1. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업	8
2. 삼형제 저수지 둘레길 조성사업	10
3. 맹동저수지 둘레길 조성사업	12
4. 도시바람길숲 조성사업	14
5. 맹동 치유의 숲 조성사업	16
6. 백야자연휴양림 보완사업	18
7. 수레의산자연휴양림 트리하우스 조성사업	20

1. 기본 현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 5팀



□ 인 력: 정원 25명 / 현원 24명(정원의 14명)

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	38	24		1	5	7	9	2	3	11
산림정책팀	7	7		1	1	2	3			
산림보호팀	8	5			1	3	1			3
녹지조성팀	7	4			1	1	2		1	2
도시공원팀	5	4			1		2	1		1
산림휴양팀	11	4			1	1	1	1	2	5

※ 정원의 인력: 공무원 5명/ 청원경찰 3명/ 청원산림보호직 3명/ 임기제 3명

2

주요기능

산림정책팀

- ❖ 조림 및 숲 가꾸기 사업
- ❖ 산지전용허가, 협의, 신고

산림보호팀

- ❖ 산불방지대책 추진 및 산림병해충 방제
- ❖ 임도시설 사업 및 균유림 업무 추진

녹지조성팀

- ❖ 숲길(등산로·둘레길) 조성사업
- ❖ 지방정원 조성 및 녹색자금 지원사업

도시공원팀

- ❖ 기후대응 도시숲 조성 및 관리
- ❖ 도시공원·녹지관리 및 점용
- ❖ 산업단지 가로수 및 녹지대 관리

산림휴양팀

- ❖ 산림휴양시설 조성·관리
- ❖ 목재문화체험장 및 국민여가캠핑장 조성·관리
- ❖ 수목원 및 자생식물원 조성·관리

3

예산규모

일반회계: 25,078백만원(군 예산의 2.81%)

(단위:백만원)

구 분	2024년 1회 추경	2023년 1회 추경	증 감(%)
계	25,078	31,340	△6,262 (△19.98%)
산 립 정 책 팀	6,521	5,131	1390 (27%)
산 립 보 호 팀	4,374	4,480	△106 (△2.3%)
녹 지 조 성 팀	5,132	13,072	△3,304 (△25.27%)
도 시 공 원 팀	4,636		
산 립 휴 양 팀	4,379	8,619	△4,240 (△49.19%)
행 정 운 영 경 비	36	38	△2 (△6.03%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 산림복지과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
조림 및 숲가꾸기	· 경제림, 경관림 조성을 위한 경제수 및 큰나무 조림 · 건강하고 우량한 산림 육성을 위한 어린나무가꾸기, 숲아베기 등 시기별 숲가꾸기	2,760	· 춘기조림사업 준공(117ha) · 조림지사후관리(풀베기) 1차 준공(310ha) · 덩굴제거, 어린나무가꾸기 및 숲아베기 실시설계 발주(330ha)	30
선도 산림경영단지 조성사업	· 10년간 조림, 숲가꾸기, 임도, 특화임산물 재배단지 등 산림경영에 필요한 산림사업을 통한 산림경영단지 조성	7,500	· 밀원수조림 준공(1ha) · 식목행사 실시(감곡면 상평리 일원) · 영산임도 실시설계 완료(1.5km)	20
7.9~7.19. 호우피해 복구사업	· 호우피해로 인한 산사태, 임도 등 산림피해지 복구 및 2차 재해방지	1,813	· 산사태(문암초천조준지구) 외 6개 지구 복구사업 24. 7. 준공 · 임도(봉전임도) 외 4개소 복구사업 24. 7. 준공	90
산불예방대책 추진	· 산불소화시설 설치 · 산불감시 진화인력 사역	2,221	· 백야자연휴양림 산불소화시설 설치 · 산불감시 진화인력 사역 · 입산통제 및 산불조심 입간판 정비 및 재설치	50
임도조성관리	· 간선임도 및 작업임도 신설 · 임도유지관리	1,018	· 임도 신설 및 보수사업 실시설계용역 준공 · 간선임도 시설공사 착공 · 임도관리단 운영	40
봉학골 산림레포츠단지 조성사업	· 산림레포츠단지 조성 1식 · 관리사무소, 산림레포츠시설 4종 및 휴식공간 조성	5,900	· 산림레포츠단지 관리사무소 건축공사 착공	30
삼형제저수지 둘레길 조성사업	· 둘레길·숲길 조성 및 데크설치·정비, 부대시설 등	9,000	· 1단계 용계저수지 조성 완료 · 2단계 무극저수지 1차 조성 준공 · 3단계 금석저수지 기본계획 준공 · 4단계 삼형제 이음길 기본계획 준공	35

맹동저수지 둘레길 조성사업	· 둘레길· 숲길 조성 및 데크설치· 정비, 부대시설 등	3,000	· 1차 둘레길 조성사업 준공 · 2차 둘레길 실시설계 준공	20
학교숲 조성사업	· 학교 내 교목, 관목 식재 및 편의시설 조성	60	· 원남초 학교숲 조성사업 실시설계 준공 · 원남초 학교숲 조성사업 착공 및 준공	100
복합산림경관숲 조성사업	· 도로변 유휴공간 교목 및 관목 등을 식재하여 산림경관 개선	60	· 복합산림경관숲 조성사업 실시설계 준공 · 복합산림경관숲 조성사업 착공 및 준공	100
도시바람길숲 조성사업	· 생성(보완)숲, 연결숲, 확산· 디딤숲을 통한 바람길숲 조성	10,000	· 도시바람길숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착공(24.6.~)	10
도시공원 및 녹지대 유지관리 사업	· 도시공원 39개소, 녹지대 유지관리(예초, 제초, 전정 등)	6,501	· 공원 및 녹지대 유지관리 작업 1회차 작업 완료(총 4회)	25
맹동 치유의 숲 조성사업	· 산림치유문화센터, 치유숲길, 치유정원, 전망대 등 조성	5,000	· 치유의 숲 건축공사 재착수(24.4.~) · 치유의 숲 토목(1차분) 준공(24.6.) · 치유의 숲 토목(2차분) 발주(24.6.) · 건축공사 추진(기초공사 중)(24.6.)	30
백야자연휴양림 보완사업	· 회의실, 숙박시설 등을 갖춘 휴양관 건립	5,800	· 공사추진(마감, 토목공사 등)(24.1.~6.) · 백야 보완사업 건축, 전기, 소방 등 설계변경(24.4.) · 물품 및 가전(세탁기등) 구입(24.6.)	80
수레의산자연휴양림 트리하우스 조성사업	· 트리하우스 2동 건립	500	· 실시설계용역 준공(24.2.) · 인허가 및 사전절차 이행(24.3.~4.) · 공사(건축, 전기, 통신)발주 및 착공 (24.4.~5.) · 공사 추진(기초공사완료)(24.6.)	30

조감도

□ 조 감 도



관리사무소



산림레포츠시설

위치도

□ 위치도



3. 맹동저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동면 맹동저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 둘레길 조성 1식(L=3.06km)
- ◆ 총사업비: 3,000백만원(도 33%, 군 67%)
- ◆ 사업내용: 둘레길·숲길 조성 및 데크설치·정비, 부대시설 등
- ◆ 공정률(이행률): 35% ◆ 완료시기: 2026. 6.

□ 추진상황

- 맹동저수지 둘레길 1차 실시설계 및 사전절차 이행 23. 11.
- 맹동저수지 둘레길 1차 조성사업 준공 24. 6.
- 맹동저수지 둘레길 2차 실시설계 준공 24. 6.

□ 향후계획

- 맹동저수지 둘레길 2차 조성사업 착공 및 준공 24. 7. ~ 10.
- 맹동저수지 둘레길 3차 조성사업 착공 25. 3.
- 맹동저수지 둘레길 3차 조성사업 준공 25. 6.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	3,000	-	1,000	2,000	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	1,000	2,000	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지조성팀	담당자	녹지8급 조새롬	전화번호	871-3753
------	---------------	-----	----------	------	----------

계획도 및 현장사진

□ 계획도



□ 현장 사진



4. 도시바람길숲 조성사업

- ◆ 위 치: 충북혁신도시 일원
- ◆ 사업기간: 2024. ~ 2027.
- ◆ 규 모: 생성(보완)숲 33,333㎡ 연결숲 11.2km, 확산·디딤숲 77,307㎡
- ◆ 총사업비: 10,000백만원(국 5,000 도 1,500 군 3,500)
- ◆ 사업내용: ① 바람생성숲(외곽산림) → ② 연결숲 (가로숲, 수변숲)→
③ 디딤·확산숲
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2027. 12.

□ 추진상황

- 도시바람길숲 조성사업 지방재정 중앙투자심사 통과 24. 3.
- 도시바람길숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착공 24. 6.

□ 향후계획

- 도시바람길숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공 25. 6.
- 도시바람길숲 조성사업 착공 및 준공 25. 7. ~ 27. 12.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	10,000	-	500	3,000	6,500
국 비	5,000	-	250	1,500	3,250
도 비	1,500	-	75	450	975
군 비	3,500	-	175	1,050	2,275
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 도시공원팀	담당자	녹지8급 조민영	전화번호	871-3782
------	---------------	-----	----------	------	----------

조감도

□ 조 감 도

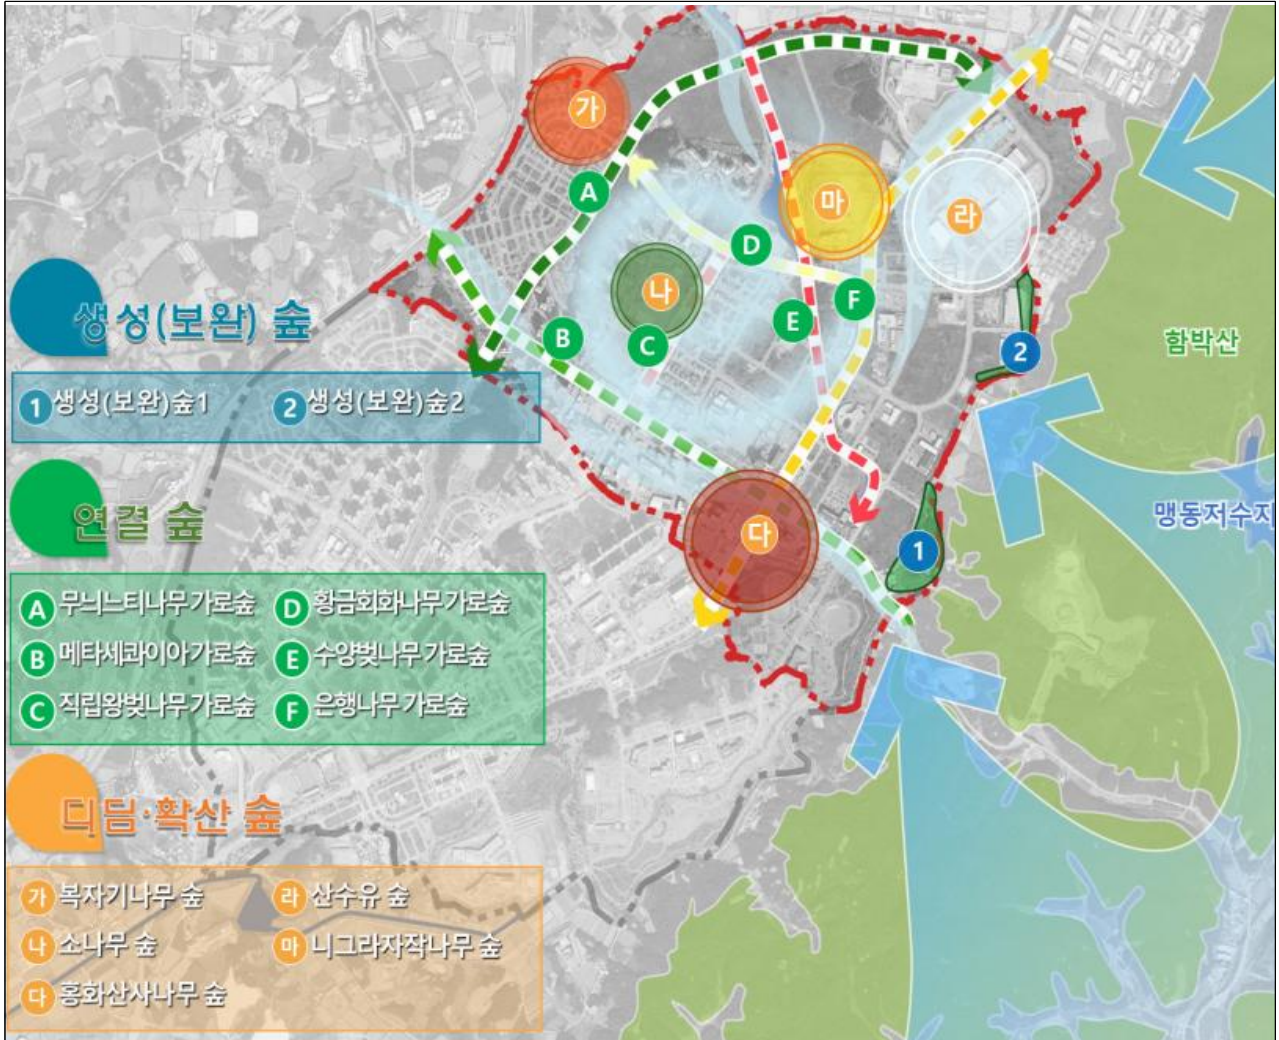

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도

