

균형발전국

제358회 임시회  
2023. 7. 13. ~ 7. 19.

\*

# 기업지원과



# 목 차


I. 기본현황 .....	3
II. 상반기 주요업무 추진실적 .....	5
III. 주요 현안 사업 .....	8
1. 음성맹동 행복주택 지원 사업 .....	8
2. 중소기업 맞춤형 지원체계 구축 .....	10
3. 음성경제 성장 기반 마련 투자유치 추진 .....	11
4. 용산산업단지 조성사업 .....	12
5. 금왕테크노밸리산업단지 조성사업 .....	20
6. 인곡산업단지 조성사업 .....	22
7. 음성 테크노폴리스산업단지 조성사업 .....	28
8. 생극제2산업단지 조성사업 .....	32
9. 삼성테크노밸리산업단지 조성사업 .....	34
10. 상우산업단지 조성사업 .....	36



# 1. 기본 현황

## 1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀

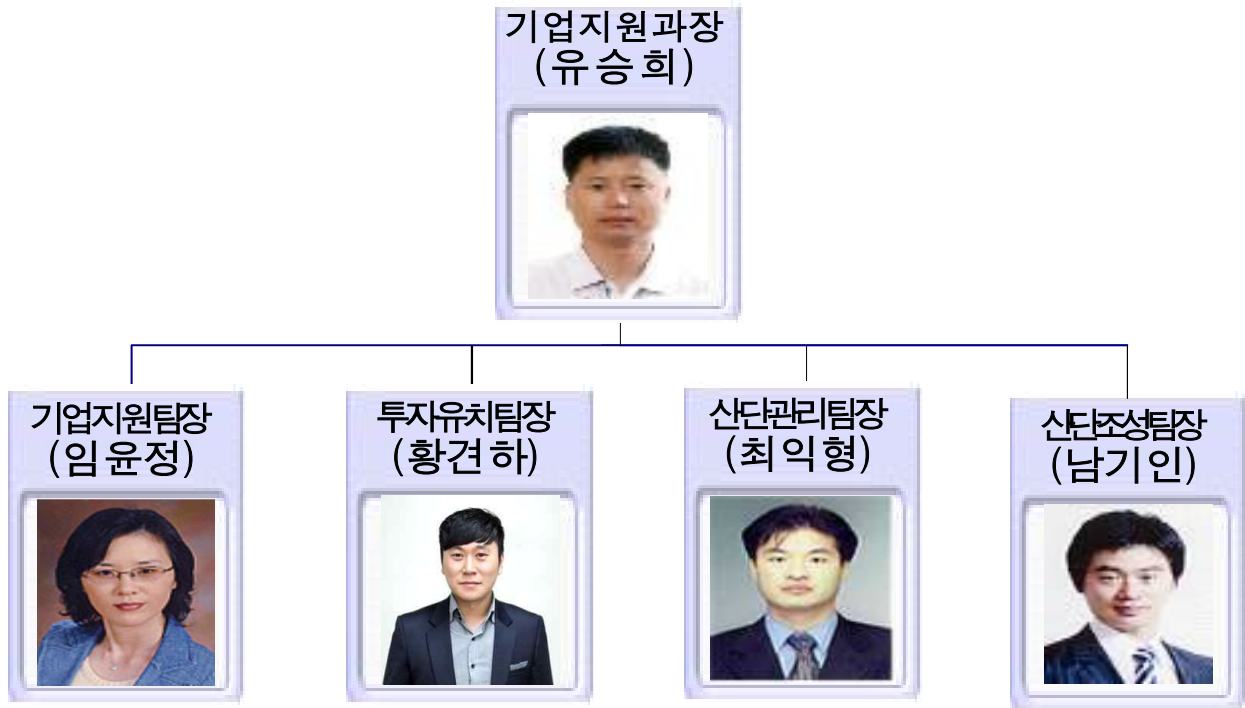

□ 인 력 : 정원 17명 / 현원 17명(정원의 1명)

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	18	17	-	1	5	6	4	1	-	1
기업지원팀	5	5	-	1	1	1	1	1	-	-
투자유치팀	4	3	-	-	2	-	1	-	-	1
산단관리팀	4	4	-	-	1	1	2	-	-	-
산단조성팀	5	5	-	-	1	4	-	-	-	-

※ 정원의 인력: 시간선택제임기제 1명

## 2

## 주요기능

### 기업지원팀

- ❖ 중소기업지원 육성시책 발굴 및 기업애로 사항 처리
- ❖ 기업 정주여건 개선사업 및 수출진흥업무 시책 발굴·추진
- ❖ 중소기업 역량강화 사업 및 중소기업 지원 업무 추진

### 투자유치팀

- ❖ 기업의 관내 투자유도를 통한 지역경제 활성화
- ❖ 투자유치기업에 대한 지원(보조금) 및 사후관리
- ❖ 투자유치 시책개발 및 홍보

### 산단관리팀

- ❖ 농공·산업단지 입주계약 및 공장등록(변경) 관련 업무
- ❖ 특수목적법인(SPC) 설립 및 사후관리
- ❖ 공영개발특별회계 및 농공단지특별회계

### 산단조성팀

- ❖ 산업단지 조성 및 인허가 업무
- ❖ 산업단지 기반시설 지원사업

## 3

## 예산규모

일반회계: 25,138백만원(군 예산의 3.31%)

(단위:백만원)

구 분	2023년 1회 추경	2022년 1회추경	증 감(%)
계	25,138	32,129	△6,991(27.8%)
기업지원팀	6,349	6,377	△28(0.4%)
투자유치팀	2,403	5,259	△2,856(118.9%)
산단관리팀	536	7,187	△6,651(1240.8%)
산단조성팀	15,819	13,279	2,540(16.1%)
행정운영경비	31	27	4(12.9%)

공영개발특별회계: 22,018백만원[도시개발사업(도시과): 4,852백만원]

농공단지특별회계: 678백만원

## II. 상반기 주요업무 추진실적

### □ 기업지원과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
음성맹동 행복주택 지원 사업	아파트 신축 1식	43,400	아파트 3개동(294세대) 신축 - 공정률: 81%	81
중소기업 맞춤형 지원체계 구축	중소기업 육성자금 이차보전 지원, 중소기업 역량강화지원 사업,(소기업형)스마트공장 보급 · 확산 지원 등	1,546	· 중소기업 수출 보험 지원사업 교부 · 중소기업 제조물 책임보험 지원 사업비 교부 · 음성군 중소기업역량강화 지원사업 사업비 교부 · (소기업형)스마트공장 보급 · 확산 지원사업 사업비 교부 · 음성군 중소기업 기숙사 임차비 지원사업 사업비 교부 · 중소기업 육성자금 이차보전 지원 사업 1/4분기 교부 · 중소기업 개별 전시 박람회 참가 지원 사업 공고 및 선정	31
음성경제 성장 기반 마련 투자유치 추진	민선8기 8조 5천억원 투자유치, 13,000명 고용 창출 ※ 2023년 목표: 5조원, 4,500명	비예산	· 9,046억원 투자유치, 1,021명 고용창출(14개사) · (주)유한양행(제약), 연성정밀화학(주)(제약), (주)JR에너지솔루션(이차전지) 등	18 (금액기준)
농공·산업단지 유지관리 사업	관내 농공·산업단지 공공시설물 유지보수	536	· 산업단지 시특법시설물 정밀안전점검 완료 · 하이텍산업단지 인도정비공사 준공 · 대소산업단지 우수처리시설 보수 공사 준공 · 맹동산업단지 내부도로 보수공사 준공 · 대풍산업단지 공공주차장 설치사업 설계 완료 및 조경공사 준공 · 음성군 산업단지 상반기 제초작업 완료	60.3
기업하기 좋은 산업단지 순차적 조성	무분별한 개별입지 공장의 난립방지를 위한 계획적인 입지를 유도하기 위한 산업시설용지 적기 공급	274,088 (민간포함)	· (조성중) 용산 외8개 산단 · (승인신청) 생극제2 외1개 산단 · (신규 지정계획 고시) 중부특장차클러스터 외2개 산단	50





# 위치도 및 현장사진

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 2. 중소기업 맞춤형 지원체계 구축

- ◆ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- ◆ 지원대상: 관내 중소기업
- ◆ 총사업비: 5,065백만원(도 38%, 군 62%)
- ◆ 사업내용: 중소기업 육성자금 이차보전 지원, 중소기업 역량강화 지원 사업,(소기업형)스마트공장 보급·확산 지원 등

### □ 추진상황

- 기업지원 알리미 소식(카카오톡) 시행 23. 1. ~ 12.
- 중소기업 수출보험료 지원 사업 23. 1. ~ 12.
- 중소기업 제조물 책임보험 지원 사업 23. 1. ~ 12.
- 중소기업 개별 전시 박람회 참가 지원 사업 23. 1. ~ 12.
- 중소기업 육성자금 이차보전 지원 사업 23. 1. ~ 12.
- 음성군 중소기업 기숙사 임차비 지원사업 23. 1. ~ 12.
- (소기업형)스마트공장 보급·확산 지원사업 23. 1. ~ 12.
- 중소기업 역량강화 지원사업 23. 1. ~ 12.

### □ 향후계획

- 음성군 유망중소기업 선정 23. 8.
- 음성군 경제포럼 23. 9.
- 기업인의 날 행사 23. 11.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	5,065	-	5,065	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	1,930	-	1,930	-	-
군 비	3,135	-	3,135	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	기업지원과 / 기업지원팀	담당자	행정8급 허지현	전화번호	871-3624
------	---------------	-----	----------	------	----------

### 3. 음성경제 성장 기반 마련 투자유치 추진

- ◆ 추진기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- ◆ 유치대상: 대기업 및 첨단산업분야(반도체, 배터리, 바이오 등) 우수기업
- ◆ 사업규모: 민선8기 8조 5천억원 투자유치, 13,000명 고용창출

#### □ 추진상황 \* 민선8기 투자유치: 18개사 / 투자금액 11,728억원 / 고용인원 1,520명

- (반도체) D사, S사 대규모 투자 협의중
  - D사: 12인치 반도체 웨이퍼 / S사: 6인치 반도체 웨이퍼
- (이차전지) L사 대규모 투자 협의중 / 이차전지 양극재
- (제약·바이오) I사 대규모 투자 협의완료, 본사 및 공장이전, 내부 투심진행
  - 무기합성, 유기합성, 원료의약품, 완제의약품 등
- (자동차) 글로벌기업 대규모 투자 대응 및 협조체계 구축 등

#### □ 대내외 여건

- 美 인플레이션 감축법(IRA), 유럽관 인플레이션 감축법(CRMA)에 따른 대기업 등 국외 투자 선회 검토
  - IRA, CRMA 관련 정부에서 대응중, 업체별 내부 법률검토 진행 상황에 맞춰 투자동향 지속 파악 및 전략적 유치활동 전개
- 세계적 금리인상으로 성장세 약화, 러-우 전쟁으로 하방리스크 존재, 3고(고물가·고금리·고환율) 현상 등으로 인한 기업의 투자심리 위축
  - 투자여건 악화로 기업체별 투자시기 지연 → 조기투자 유도를 위한 맞춤형 투자 지원

#### □ 향후계획(목표)

- L사, S사 투자유치(MOU) 23. 하반기
- D사, I사 투자유치(MOU) 23. 12.

부서/팀	기업지원과 / 투자유치팀	담당자	행정6급 황건하	전화번호	871-3131
------	---------------	-----	----------	------	----------





# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도



## ◆ 용산산업단지 지원사업

### □ 진입도로 개설사업

- 사업기간: 2021. ~ 2025.
- 규 모: L=2.76km, B=25m(4차로, 교량 1개소 포함)
- 총사업비: 27,582백만원 (국비 100%) ※ 총사업비 변경예정
- 사업내용: 산업단지 진입도로 개설
- 공정률(이행률): 5%
- 완료시기: 2025. 12.

#### ○ 추진상황

- 실시설계 용역 착수 21. 4. 30.
- 사업기간 변경(행정절차, 보상 등) 국토부 협의 22. 3. 22.
- 실시설계 용역 준공 22. 12. 23.
- 국토부 총사업비 조정 사전협의 (3차) 23. 2. ~ 5.
- 설계 보완 진행중 23. 5. ~ 7.

#### ○ 문제점 및 대책

- 설계완료 전 총사업비 조정 시 국토부 요구사항에 따른 설계보완 중  
(총사업비: 음성군 330억 ⇨ 국토부 300억 미만)

#### ○ 향후계획

- 총사업비, 사업기간(변경) 협의 및 신청 23. 8. ~
- 공사 및 감리 조달청 의뢰(원가심사, 계약의뢰) 23. 8. ~
- 토지보상계획 공고 23. 10.
- 공사 및 감리 계약자 선정(조달청) 23. 10. ~ 11.
- 공사 착공 23. 12. ~
- 공사 준공 25. 12.

#### ○ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	27,582	6,492	6,265	1,212	13,613
국 비	27,582	6,492	6,265	1,212	13,613



# 위치도

## □ 위치도

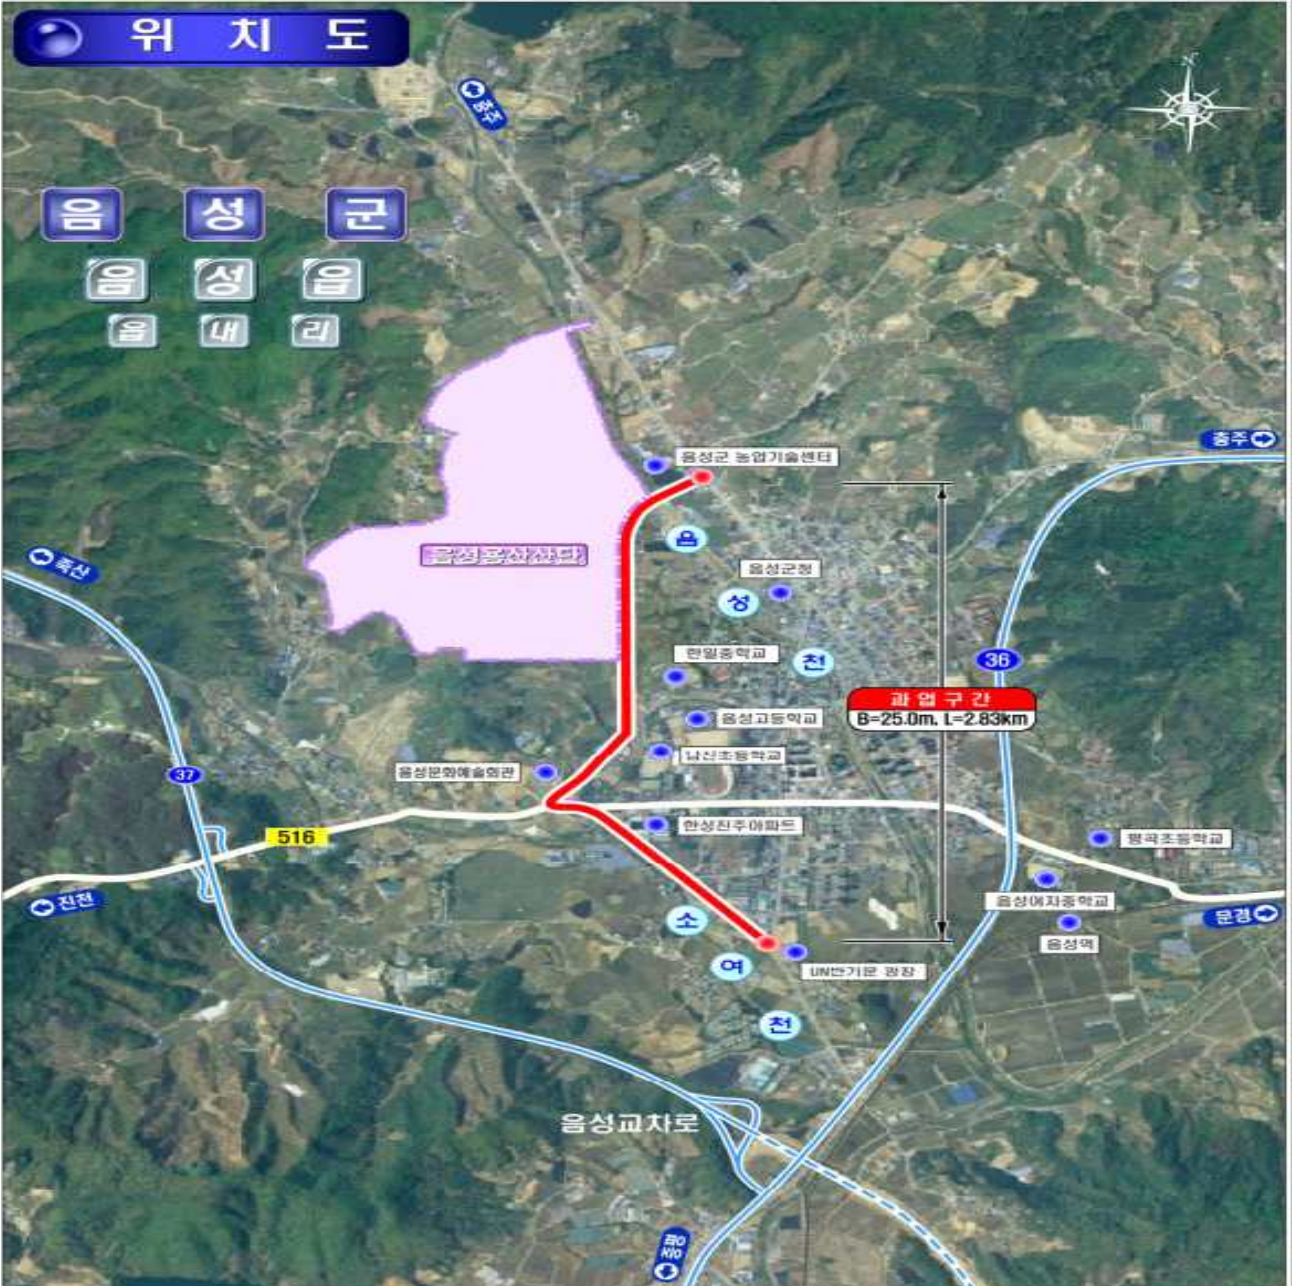

## □ 공공폐수처리시설 설치사업

- 사업기간: 2021. ~ 2024. (1단계)
- 규 모: 처리용량 Q=4,400m<sup>3</sup>/일(1단계 1,100m<sup>3</sup>/일)
- 총사업비: 16,767백만원 (국비 35%, 민간 65%)
- 사업내용: 공공폐수처리시설 1단계 설치
- 공정률(이행률): 22%
- 완료시기: 2024. 6.

### ○ 추진상황

- 공공폐수처리시설 기본계획 승인 21. 3. 26.
- 실시설계 용역 착수 21. 4. 8.
- 공공폐수처리시설 실시설계 승인 22. 3. 30.
- 실시설계 용역 준공 22. 5. 6.
- 공공폐수처리시설 위·수탁협약 (군-시행사) 22. 5. 24.
- 공공폐수처리시설 시공사, 감리사 선정 22. 8. 31.
- 공공폐수처리시설 공사 착공(1단계) 22. 9. 1.

### ○ 향후계획

- 공공폐수처리시설 공사 준공(1단계) 24. 6.

### ○ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	16,767	3,274	9,827	3,666	-
국 비	5,860	759	1,940	3,161	-
민 간	10,907	2,515	7,887	505	-



# 조감도

## □ 조 감 도



## □ 공업용수공급시설 설치사업

- 사업기간: 2021. ~ 2024. 12.
- 규 모: 배수지  $V=4,000\text{m}^3$ , 송수관로  $L=4.445\text{km}(D=350\text{mm})$
- 총사업비: 5,950백만원 (前균특(도) 70%, 군비 30%)
- 사업내용: 공업용수공급시설 설치
- 공정률(이행률): 5%
- 완료시기: 2024. 12.

### ○ 추진상황

- 실시설계 용역 착수 21. 4. 21.
- 실시설계 용역 완료 22. 12. 20.
- 공업용수공급시설 공사 착공 23. 1. 6.
- 국도, 철도 추진구간 협의 완료(충주국토관리사무소, 코제일) 23. 2. ~ 6.

### ○ 향후계획

- 공업용수도 분기구 협의 (한국수자원공사) 23. 6.
- 공업용수공급시설 공사 준공 24. 12.

### ○ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	5,950	1,316	500	2,067	2,067
前균특(도)	4,165	920	350	1,447	1,448
군 비	1,785	396	150	620	619

부서/팀	기업지원과/ 산단조성팀	담당자	시설7급 김진우	전화번호	871-3964
------	--------------	-----	----------	------	----------










# 위치도 및 조감도

## □ 위치도

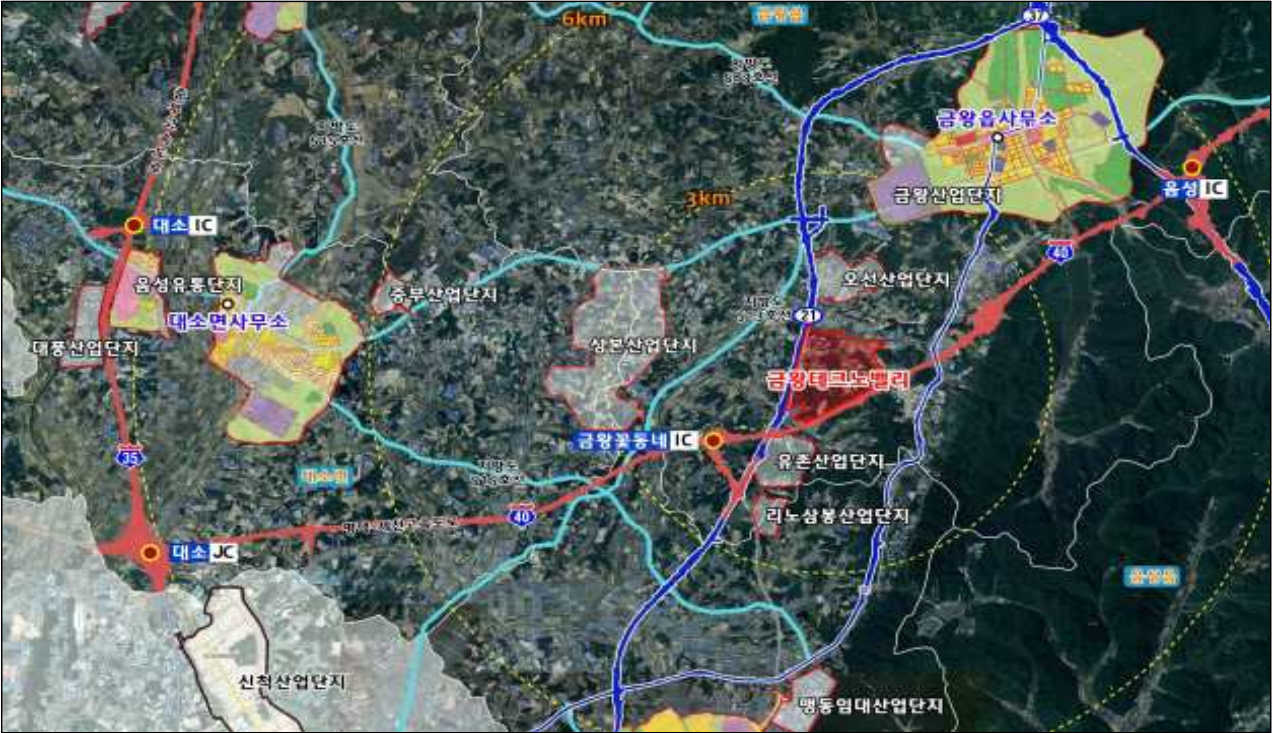

## □ 조감도



## 6. 인곡산업단지 조성사업

- ◆ 위 치: 금왕읍 유촌리, 맹동면 인곡리 일원
- ◆ 사업기간: 2016. ~ 2024.
- ◆ 규 모: 1,729,666㎡
- ◆ 총사업비: 270,817백만원 (민간 100%)
- ◆ 사업내용: 산업단지 조성사업
- ◆ 공정률(이행률): 32%                      ◆ 완료시기: 2024. 12.

### □ 추진상황

- 상호협력 협약 체결(음성군↔충북개발공사)                      16. 3. 10.
- 산업단지계획 승인    19. 5. 31.
- 토지·지장물 보상    20. 11. 2.
- 공사 착공    21. 2. 22.

### □ 향후계획

- 산업단지 분양    23. 7.
- 산업단지 준공    24. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	270,817	187,567	49,215	34,035	-
민 간	270,817	187,567	49,215	34,035	-

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 남기정	전화번호	871-3962
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도



## ◆ 인곡산업단지 지원사업

### □ 진입도로 개설사업

- 사업기간: 2019. ~ 2025.
- 규 모: L=2.12km, B=19m(4차로, 교량 포함)
- 총사업비: 26,914백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 산업단지 진입도로 개설
- 공정률(이행률): 12%
- 완료시기: 2025. 11.

#### ○ 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 착수 19. 5. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 20. 12. 14.
- 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 21. 3. 26.
- 진입도로 공사 착공 21. 11. 12.
- 실시계획인가 21. 12. 24.
- 공사계약에 따른 총사업비 및 공사기간 조정 22. 3. 21.

#### ○ 문제점 및 대책

- 보상협의 지연(보상금액 불만족)으로 공사추진 지연(보상률 53%)  
→ 보상협의(3차) 추진 중으로 향후 8월경 수용재결 신청 예정

#### ○ 향후계획

- 진입도로 공사 준공 25. 11.

#### ○ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	26,914	16,568	2,281	1,500	6,565
국 비	26,914	16,568	2,281	1,500	6,565




# 위치도 및 평면도

## □ 위치도



## □ 평면도

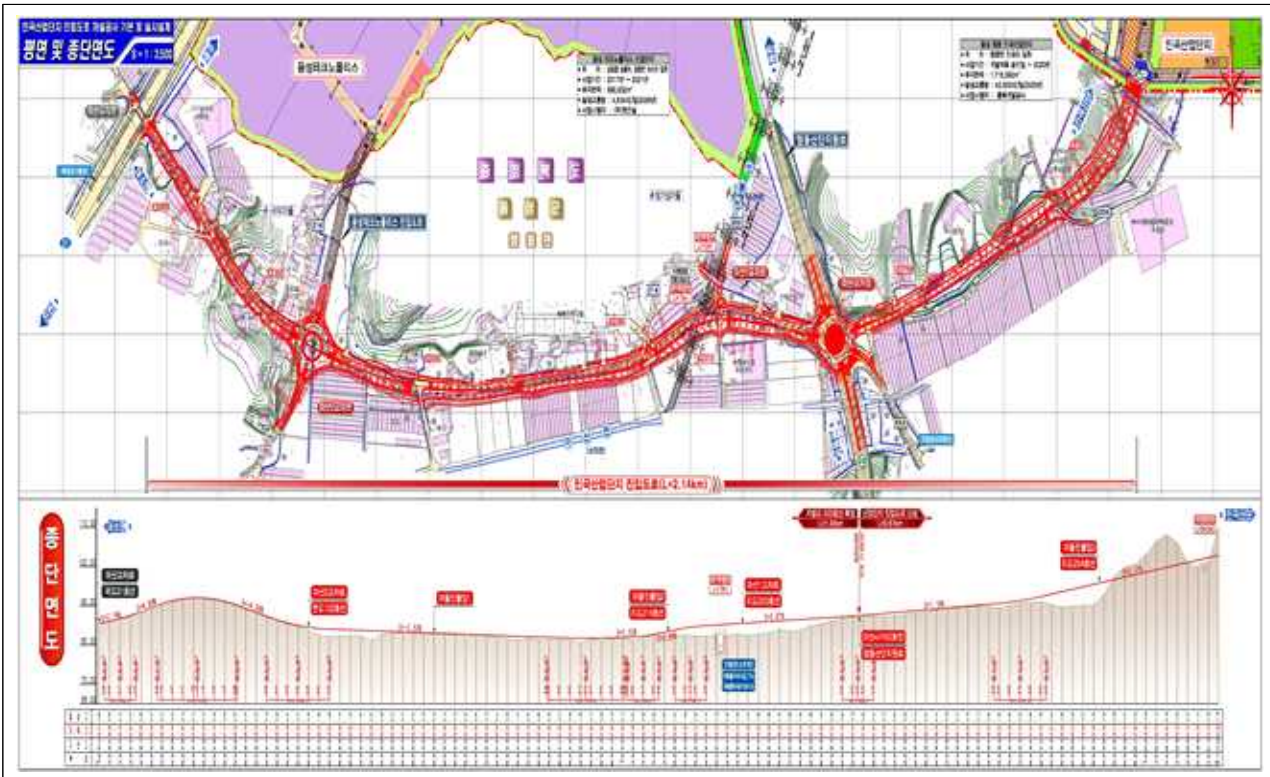

## □ 공공폐수처리시설 설치사업

- 사업기간: 2021. ~ 2024. (1단계)
- 규 모: 처리용량 Q=5,700m<sup>3</sup>/일(1단계 1,400m<sup>3</sup>/일)
- 총사업비: 26,837백만원 (국비 15.6%, 민간 84.4%)
- 사업내용: 공공폐수처리시설 1단계 설치
- 공정률(이행률): 5%
- 완료시기: 2025. 3.

### ○ 추진상황

- 공공폐수처리시설 기본계획 승인 20. 4. 16.
- 실시설계 용역 착수 20. 12. 16.
- 공공폐수처리시설 공사 착공(1단계) 23. 4. 11.
- 실시설계 용역 준공 23. 4. 23.

### ○ 향후계획

- 공공폐수처리시설 공사 준공(1단계) 25. 3. 30.

### ○ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	26,837	3,976	3,478	19,383	-
국 비	4,188	1,381	1,045	1,762	-
민 간	22,649	2,595	2,433	17,621	-

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 남기정	전화번호	871-3962
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도



## 7. 음성 테크노폴리스산업단지 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동면 마산리 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 653,484㎡
- ◆ 총사업비: 136,500백만원 (민간 100%)
- ◆ 사업내용: 산업단지 조성사업
- ◆ 공정률(이행률): 착공전
- ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 산업단지계획 승인 신청 18. 6. 18.
- 농림부 협의 포함 관계기관 협의 완료 19. 12. 20.
- 산업단지 계획 승인 22. 10. 07.

### □ 문제점 및 대책

- 산업단지 승인 전 계약금 시세와 현 보상금(잔금) 시세 차이로 인한 토지보상 협의 지연(보상률 45%)
- 산업단지 승인 전 계약건에 대한 처리 완료 후 보상계획 공고 (감정평가)에 따른 산업단지 내 잔여필지 보상협의 진행 예정

### □ 향후계획

- 보상계획 공고 23. 10.
- 산업단지 공사 착공 24. 2.
- 산업단지 공사 준공 25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)


재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	136,500	78,025	29,238	29,237	-
민 간	136,500	78,025	29,238	29,237	-

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 임성수	전화번호	871-3963
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 위치도

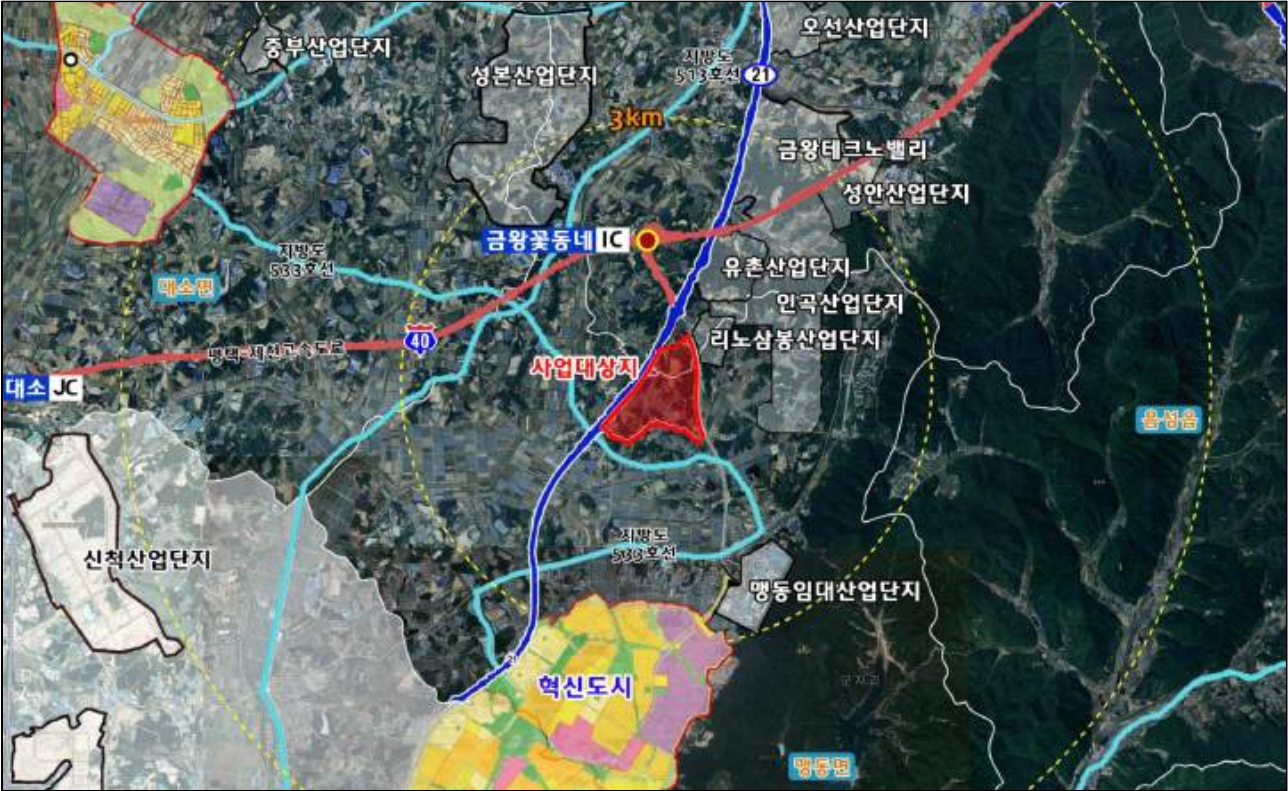

## □ 조감도



## ◆ 음성 테크노폴리스산업단지 지원사업

### □ 진입도로 개설사업

- 사업기간: 2020. ~ 2024.
- 규 모: L=0.154km, B=12m(2차로, 부체도로 포함)
- 총사업비: 1,295백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 산업단지 진입도로 개설
- 공정률(이행률): 5%
- 완료시기: 2024. 12.

#### ○ 추진상황

- 실시계획 인가 22. 9. 30.
- 보상계획 공고 22. 10. 19.
- 공사계약(인곡산단 진입도로 설계변경 계상) 22. 12. 5.

#### ○ 문제점 및 대책

- 사업구역 내 토지보상 중으로 금년도 토지보상 완료 및 지장물 철거 후 공사 추진(보상률 43%, 7필지 중 3필지 보상완료)

#### ○ 향후계획

- 진입도로 공사 실착공 23. 11.
- 진입도로 공사 준공 24. 12.

#### ○ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	1,295	983	103	209	0
국 비	1,295	983	103	209	0

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 임성수	전화번호	871-3963
------	---------------	-----	----------	------	----------





## 8. 생극제2산업단지 조성사업

- ◆ 위 치: 생극면 신양리 산35번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 403,175㎡
- ◆ 총사업비: 136,500백만원 (민간 100%)
- ◆ 사업내용: 산업단지 조성사업
- ◆ 공정률(이행률): 착공전 ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 투자방향서 제출 21. 2. 8.
- 산업단지 지정계획 반영 22. 4. 8.
- 산업단지계획 승인 신청 22. 8. 10.

### □ 향후계획

- 산업단지계획 승인 23. 11.
- 산업단지 공사 착공 24. 2.
- 산업단지 공사 준공 25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)


재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	136,500	32,300	51,600	33,300	19,300
민 간	136,500	32,300	51,600	33,300	19,300

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 임성수	전화번호	871-3963
------	---------------	-----	----------	------	----------




# 위치도 및 토지이용계획

## □ 위치도

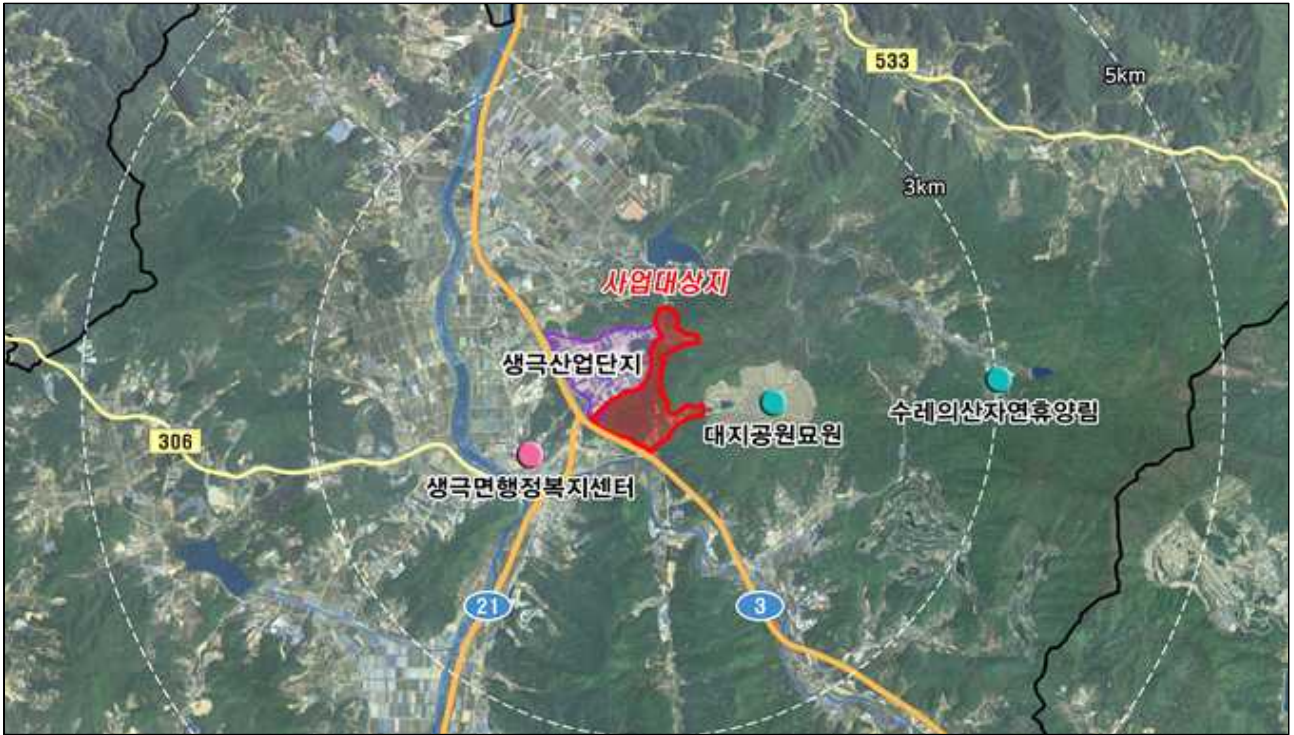

## □ 토지이용계획(안)

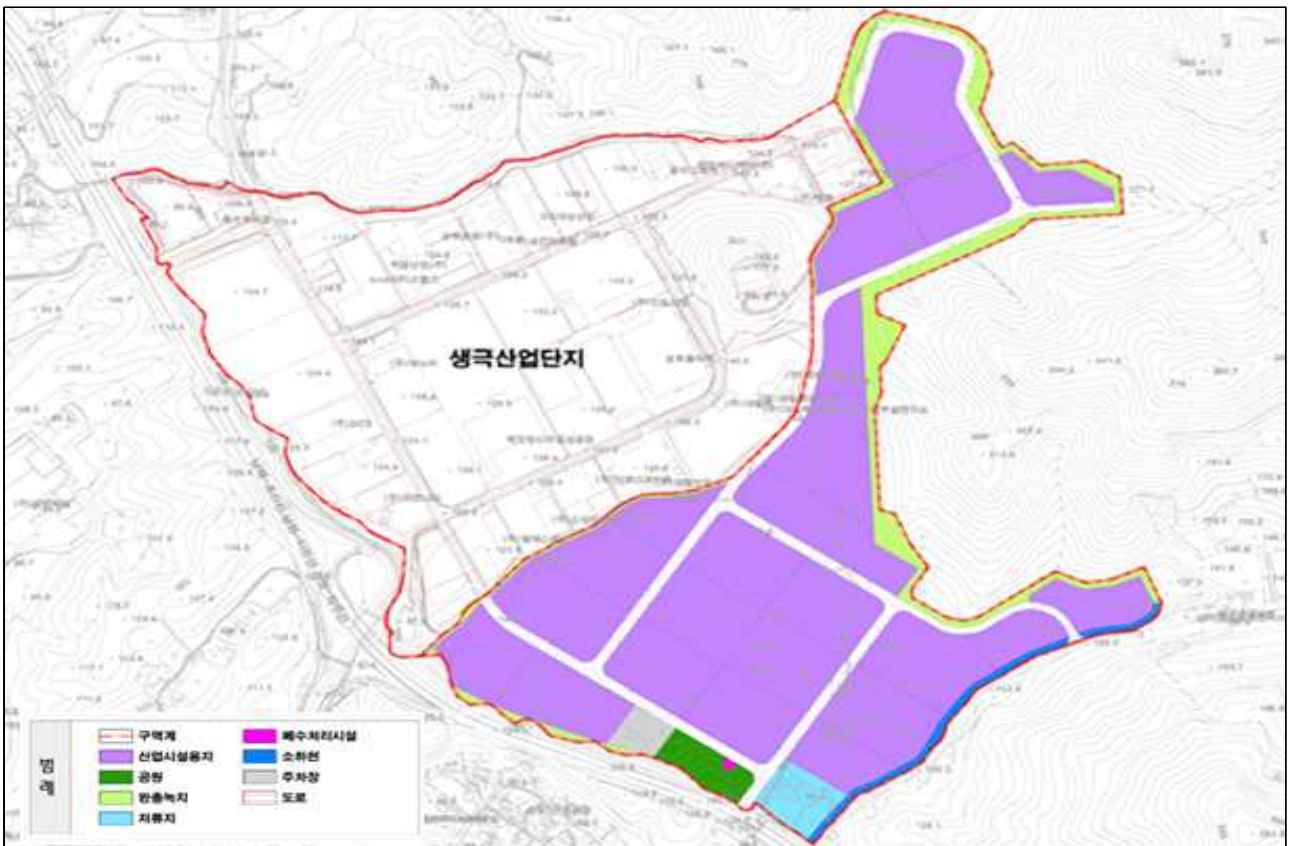

## 9. 삼성테크노밸리산업단지 조성사업

- ◆ 위치: 삼성면 용성리, 양덕리 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규모: 1,579,855㎡(약 47.8만평)
- ◆ 총사업비: 357,030백만원 (민간 100%)
- ◆ 사업내용: 산업단지 조성사업
- ◆ 공정률(이행률): 착공전 ◆ 완료시기: 2025. 12.

### □ 추진상황

- 투자방향서 제출 16. 8. 31.
- 산업단지 지정계획고시 22. 1. 7.
- 산업단지계획 승인신청 22. 6. 28.
- 합동설명회 개최 22. 8. 26.
- 주민공청회 개최 22. 11. 25.

### □ 문제점 및 대책

- 산업단지 편입예정 마을(용성3리 가산이) 반대 민원  
 ⇨ 사업시행자가 이주대책 수립을 위해 지속 협의 중

### □ 향후계획

- 산업단지계획 승인 23. 9.
- 산업단지 공사 착공 24. 3.
- 산업단지 공사 준공 25. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	357,030	129,000	86,000	71,015	71,015
민 간	357,030	129,000	86,000	71,015	71,015

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 승지민	전화번호	871-3965
------	---------------	-----	----------	------	----------





## 10. 상우산업단지 조성사업

- ◆ 위치: 음성군 감곡면 왕장리, 상우리 일원
- ◆ 사업기간: 2005. ~ 2023. 6.
- ◆ 규모: 581,073㎡
- ◆ 총사업비: 85,000백만원 (민간 100%)
- ◆ 사업내용: 산업단지 조성사업
- ◆ 공정률(이행률): 95% ◆ 완료시기: 2023. 06.

### □ 추진상황

- 산업단지계획 승인 05. 2. 14.
- 산업단지 조성공사 착공(실착공) 19. 5. 15.
- 산업단지계획 변경(사업기간 연장 '21. 6. → '21. 12.) 21. 6. 11.
- 산업단지계획 변경(사업기간 연장 '21. 12. → '22. 6.) 21. 12. 21.
- 산업단지계획 변경(사업기간 연장 '22. 6. → '23. 6.) 22. 6. 22.
- 산업단지계획 변경(토지이용계획 변경) 신청 22. 9. 21.
- 국가첨단전략산업 특화단지 지정 신청서 제출 23. 02. 27.
- 산업단지계획 변경(사업기간 연장 '23. 6. → '23. 9.) 23. 6. 23.

### □ 문제점 및 대책

- 국가첨단전략산업 특화단지 지정 추진中  
→ 특화단지 지정 결과에 따라 향후계획 변경 예정

### □ 향후계획

- 산업단지계획 변경 심의(충청북도) 23. 08. 29.
- 국가첨단전략사업 특화단지 지정 승인 23. 하반기
- 산업단지 조성공사 준공 23. 하반기

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2023확보	2024요구	2025이후
합 계	85,000	85,000	-	-	-
민 간	85,000	85,000	-	-	-

부서/팀	기업지원과 / 산단조성팀	담당자	시설7급 임성수	전화번호	871-3963
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 토지이용계획

## □ 위치도



## □ 토지이용계획(안) 변경( '22. 9.)

