

균형발전국

제369회 임시회

2024. 7. 18. ~ 7. 26.

*

재난안전과


목 차

I . 기본현황	3
II . 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 주요 현안 사업	7
1. 재난대응 안전한국 훈련	7
2. 중대(산업·시민) 재해 예방	8
3. 맹동119안전센터 승격 및 신설	9
4. 통합방위태세 확립 및 비상대비훈련	11
5. 소하천정비사업 추진	12
6. 23년 호우피해 하천 재해복구사업 추진	19
7. 신천 자연재해위험개선지구 정비사업	20
8. 무극 자연재해위험개선지구 정비사업	22
9. 목골 자연재해위험개선지구 정비사업	24
10. 모래내 풍수해생활권 종합정비사업	26
11. 도청 자연재해위험개선지구 정비사업	28
12. 소식 자연재해위험개선지구 정비사업	30
13. 군민안전통합지원센터 설치 및 운영	32

I. 기본 현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 6팀

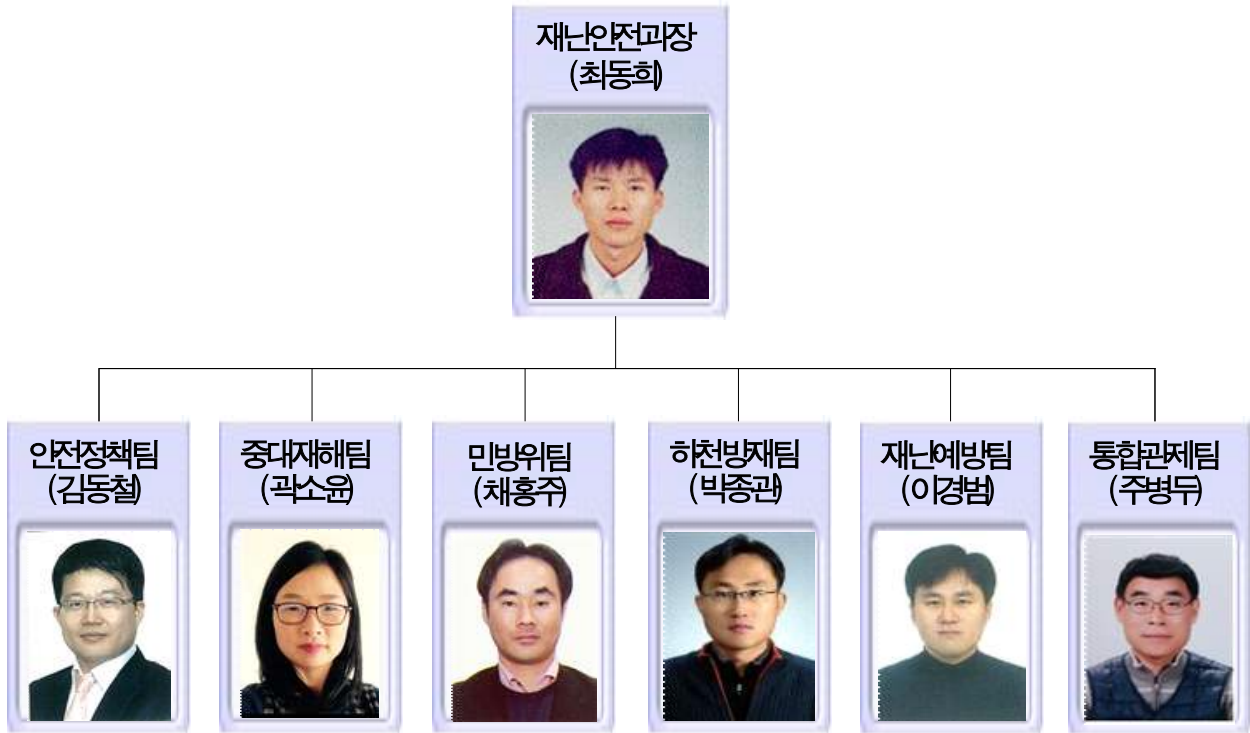

□ 인 력: 정원 29명 / 현원 28명(결원 1명)

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약 및 기타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	44	28		1	10	7	7	3		16
안전정책팀	6	6		1	2	1	1	1		
중대재해팀	3	3			1	1	1			
민방위팀	4	4			1	1	2			
하천방재팀	6	6			2	2	1	1		
재난예방팀	5	5			2		2	1		
통합관제팀	20	4			2	2				16

※ 정원외 인력: 16명 포함(공무직 14명, 기간제 2명)

2

주요기능

안전정책팀

- ❖ 철저한 종합상황관리로 신속한 대응체제 확립
- ❖ 군민이 참여하는 안전문화 정착

중대재해팀

- ❖ 군민을 위한 안전·보건관리체계 구축
- ❖ 사업장 위험요인 제거를 통한 중대재해 예방

민방위팀

- ❖ 민방위 자원의 합리적·효율적 운영 관리
- ❖ 사회안전확보를 위한 「생활안전지킴이」 역할 수행

하천방재팀

- ❖ 자연친화적 소하천 정비사업으로 주민생활환경 개선
- ❖ 호우피해 복구계획 수립 및 신속한 하천 복구 추진

재난예방팀

- ❖ 자연재난 대비 예·경보시스템 구축 등 사전대비 철저
- ❖ 재해위험지구 정비사업으로 풍수해 대비

통합관제팀

- ❖ 통합관제센터 영상관제 운영, 영상정보처리기기 설치 관리, 스마트시티 통합플랫폼 운영, 개인영상정보 관리

3

예산규모

□ 일반회계: 35,670백만원(군 예산의 4%)

(단위: 백만원)

구 분	2024년 1회추경	2023년 1회추경	증 감(%)
계	35,670	35,507	163 (0.46%)
안 전 정 책 팀	285	231	54 (23.3%)
중 대 재 해 팀	96	65	31 (47.6%)
민 방 위 팀	837	526	311 (59.1%)
하 천 방 재 팀	12,730	10,874	1,856 (17%)
재 난 예 방 팀	17,687	19,181	△1,494 (△7.7%)
통 합 관 제 팀	2,520	3,362	△842 (△25%)
행 정 운 영 경 비	42	39	3 (7.6%)
재 무 활 동 (반환금, 전출금)	1,473	1,229	244 (19.8%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 재난안전과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
안전보안관 운영 활성화	· 지역 내 잠재적 위험 요인 사전 차단 · 민간주도 안전문화 확산	60	· 안전보안관 미활동 지역 추가모집 중 · 7월말 안전보안관 대상 교육 실시 추진예정	50
중대(산업·시민) 재해예방	「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 관계 법령에서 정한 조치사항을 이행·점검하여 소속 근로자 및 이용자에게 대한 안전 및 보건 확보	96.54	· 관리감독자 안전보건교육 실시 (부서장급 40명 / 2~8월) · '24년 중대산업재해 예방계획 수립 (39개 부서 / 3월) · '24년 중대시민재해 안전계획 수립 (97개소 / 3월) · 음성군 사업장 위험성평가 실시 (산재발생 고위험 사업장 53개소 / 6~8월) · 근골격계 부담작업 유해요인 조사 (25개부서/ 현업근로자 / 6~8월) · 상반기 산업·시민재해 예방 이행점검 추진(6월) (산업재해 전부서(39개) / 시민재해 대상 공중이용시설 97개소)	60
통합방위태세 확립 및 비상대비훈련	· 비상대비훈련, 통합방위협의회 개최 등 지역방위태세 구축	163	· 2024년 통합방위협의회 개최(1,2분기) - 일시: 3. 26.(화), 6.26.(수) / 서면회의 - 회의내용: 음성군 통합방위 운영 계획 · 2024년 충무훈련 실시(5.20.~24.) - 전시종합상황실 운영 및 상황조치 - 생산물자동원훈련 점검 등	40
맹동119안전센터 승격 및 신설	· 맹동119안전센터 신설을 위한 부지 확보	5,660	· 실시계획인가(사업인정) 완료 · 부지조성 사업비 1회 추경예산 확보 · 사유지 토지보상협의 진행(3, 4차) · 토지수용재결 신청서 사전 검토 등	30
소하천정비사업 추진	· 관내 소하천 5개소의 소하천정비를 통한 치수 및 이수기능 확보로 농경지보호 및 호우피해 예방	22,561	· 오근리도당소하천 호안정비 1.0km 및 소교량 2개소 완료 · 공산정소하천 호안정비 0.5km 및 소교량 1개소 재가설 · 갑산, 찬샘골 소하천 실시설계 용역 추진 · 윗두리실 소하천정비사업 준공	60
국가·지방하천 유지관리사업	· 하천시설물에 대한 유지보수 및 하천변 환경정비를 통한 지역주민과 함께하는 친수공간 확보	592	· 국가하천 안전점검용역 3건 추진 · 국가하천 예초작업 1건 추진 · 마송천 지방하천 유지관리사업 준공	80

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
소하천 유지관리 및 재난관리기금사업	· 소하천 내 노후 및 파손 호안 정비 및 시설물 유지관리를 통해 재해예방 및 지역 주민의 생명과 재산 보호	1,980	· 소하천 유지관리사업 4건 추진 · 재난관리 기금사업 8건 준공 · 하천변 예초작업 4건 추진	75
음성군 재해예방사업	[신천지구] · 호안정비 3.0km · 교량5개소, 배수펌프장 1개소 · 우수관로 0.35km 등	22,824	· 교량4개소 및 분기수로 설치 완료 · 배수펌프장 1개소 완료 · 호안정비 2.8km 완료	88
	[무극지구] · 호안정비 0.52km · 교량3개소 · 우수관거 1.12km · 하도정비 1.24km 등	23,008	· 교량3개소 설치 완료 · 가동보 1개소 설치 완료 · 호안정비 0.50km 완료 · 하도정비 1.24km 완료 · 우수관거 0.5km 완료	80
	[목골지구] · 호안정비 1.78km · 교량4개소, 가동보1개소 · 분기수로 248m	14,800	· 분기수로 설치 중(90m정도 완료) · 교량2개소 설치 완료 · 보상 80% 완료(45필지중 36필지)	45
	[모래내지구] · 소하천정비 3.04km · 지방하천 정비 0.28km · 우수관거 개선 573m 등	28,590	· 저수지 상류부 호안정비 중 · 보상 75% 완료(129필지중 95필지)	30
	[도청지구] · 하천정비 2.85km · 교량8개소 · 낙차공 5개소 등	15,000	· 공사발주 완료	10
	[소석지구] · 소하천정비 6.9km · 교량12개소 · 낙차공 5개소 등	26,100	· 실시설계발주 완료	0
	스마트 공공안전 및 보안인프라 조성	· 노후 영상정보처리기기 교체 · 상상대로 행복한 음성만들기 영상정보처리기기 설치 사업 · 비상벨 추가 설치	709	· 노후 영상정보처리기기 교체 54대 · 상상대로 행복한 음성만들기 26개소 52대 설치 완료(351백만원) - 하반기 12개소 26대 설치 예정(178백만원) · 비상벨추가 설치 23개소
재난안전통신망 활용 재난대응 역량 강화 (특수시책)	· 재난안전통신망 활용 재난대응력 향상 및 역할분담을 통한 재난대응체계 확립	-	· 찾아가는 현장교육 및 상황전파 훈련 실시(4. 17. / 대회의실) · 긴급구조통제관 불시가동 훈련 연계 재난안전통신망 합동훈련 실시(6. 27. / 백야휴양림 일원)	70

III. 주요 현안 사업

1. 재난대응 안전한국 훈련

- ◆ 기 간: 2024. 10. 21.(월) ~ 11. 1.(금) / 2주간
- ◆ 참여기관: 음성군, 유관기관 및 단체, 지역주민 등
- ◆ 총사업비: 7.8백만원 (국 4, 도 1.9, 군 1.9)
- ◆ 내 용
 - 토론 및 현장훈련: 재난상황 대처 종합훈련(풍수해 예정)
 - 주민참여 훈련: 소소심 및 안전문화 캠페인 등
 - 비상소집 훈련 등

□ 필요성 및 추진근거

- 대규모 재난 발생 시 재난대응 협력체계 구축
- 재난 및 안전관리기본법」 제35조 (재난대비훈련 실시)

□ 향후계획

- 기본계획 수립 및 훈련 관계기관 설명회 참석 24. 8.
- ‘24년 안전한국훈련 추진계획 수립 24. 8. ~ 9.
- 재난대응 안전한국훈련 실시 24. 10.

□ 기대효과

- 실질적 재난대응 역량강화로 안전음성 실현
- 재난 훈련을 통하여 재난 발생 시 대처방법 숙달
- 재난관리책임기관 간 공조·협력 체계 구축

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	7.8	-	7.8	-	-
국 비	4	-	4	-	-
도 비	1.9	-	1.9	-	-
군 비	1.9	-	1.9	-	-

부서/팀	재난안전과 / 안전정책팀	담당자	행정6급 신정섭	전화번호	871-3252
------	---------------	-----	----------	------	----------

2. 중대(산업·시민) 재해 예방

- ◆ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 안전 관계 법령에서 정한 조치사항을 이행·점검하여
- ◆ 소속 근로자 및 이용자들에 대한 안전 및 보건을 확보

□ 추진상황

- 2024년 안전·보건관리 위탁용역 계약 체결 23. 12. 15.
- 2024년 안전보건교육 실시(부군수·부서장급 40명) 24. 2. ~ 8.
- 2024년 음성군 중대재해 예방 종합계획 수립 24. 2. 15.
- 2024년 산업재해 예방계획 수립(전부서) 24. 3. 11.
- 2024년 중대시민재해 안전계획 수립(97개소) 24. 3. 13.
- 중대재해배상책임공제 가입 24. 5. 31.
- 상반기 산업·시민재해 예방 이행점검 추진 24. 6. 13 ~ 6. 28
※ 산업재해 39개부서(현업 25·비현업 14) / 시민재해대상시설 등 97개소
- 안전·보건관리자 선임(7. 1일자 인사발령) 24. 7. 1.
- 2024년 음성군 사업장 위험성 평가 실시(전부서) 24. 6. ~ 8.
- 2024년 근골격계 부담작업 유해요인 조사 실시(25개 부서) 24. 6. ~ 8.

□ 향후계획

- 2024년 하반기 안전보건교육 실시(정기인사 반영) 24. 7. ~ 9.
- 제3종 시설물(66개소) 지정·해제를 위한 실태조사 24. 11.까지
- 하반기 산업·시민재해 예방 이행점검 추진 24. 11. ~ 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	96.54	-	96.54	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	96.54	-	96.54	-	-

부서/팀	재난안전과/중대재해팀	담당자	간호7급 김영은 시설8급 김선문	전화번호	871-3292 871-3293
------	-------------	-----	----------------------	------	----------------------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



4. 통합방위태세 확립 및 비상대비훈련

- ◆ 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- ◆ 총사업비: 163백만원 (군비 100%)
- ◆ 사업내용: 향토방위태세 확립 및 비상대비 훈련

□ 추진방침

- 유관기관 협력을 통한 통합방위태세 구축으로 재난 및 비상대비 업무의 효율성 증대
- 향토부대의 예비군 자원관리를 위한 행정 및 물적 지속적인 지원을 통한 지역방위태세 구축

□ 추진상황 및 계획

- 민관군 통합방위협의회 개최 연 4회(분기별)
- 중점관리자원 확인의 날 행사 실시 연 4회(분기별)
- 주민신고망 정비 및 홍보 연 4회(분기별)
- 비상대비 훈련 실시 24. 5. ~ 10.
- 충무훈련(5.20.~24.완료), 을지연습(8.19.~22.), 화랑훈련(10.28.~11.1.)

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	163	-	163	-	-
군 비	163	-	163	-	-

□ 기대효과

- 통합방위협의회의 유기적인 협력체계 구축으로 비상사태 시 신속한 대응태세 확립
- 향토부대 육성지원을 통해 군 작전능력 강화 및 지역의 견고한 방어태세 구축

부서/팀	재난안전과 / 민방위팀	담당자	방재안전8급 양희현	전화번호	871-3262
------	--------------	-----	------------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도(오근리도당 소하천)



□ 전경사진(오근리도당소하천)




□ 위치도(공산정소하천)



□ 전경사진(공산정소하천)



□ 위치도(갑산소하천)

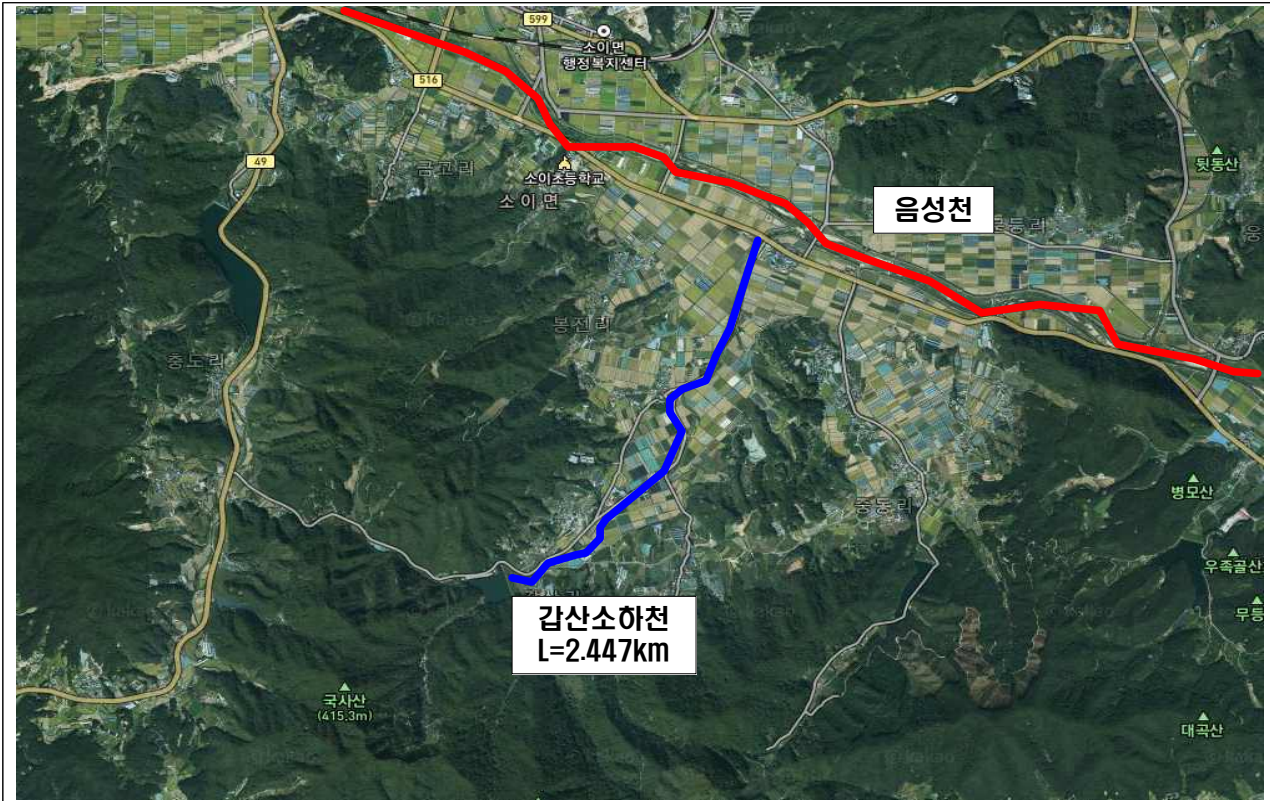

□ 전경사진(갑산소하천)



□ 위치도(찬샘골소하천)



□ 전경사진(찬샘골소하천)




□ 위치도(윗두리실소하천)




□ 전경사진(윗두리실소하천)



□ 위치도(절골소하천)

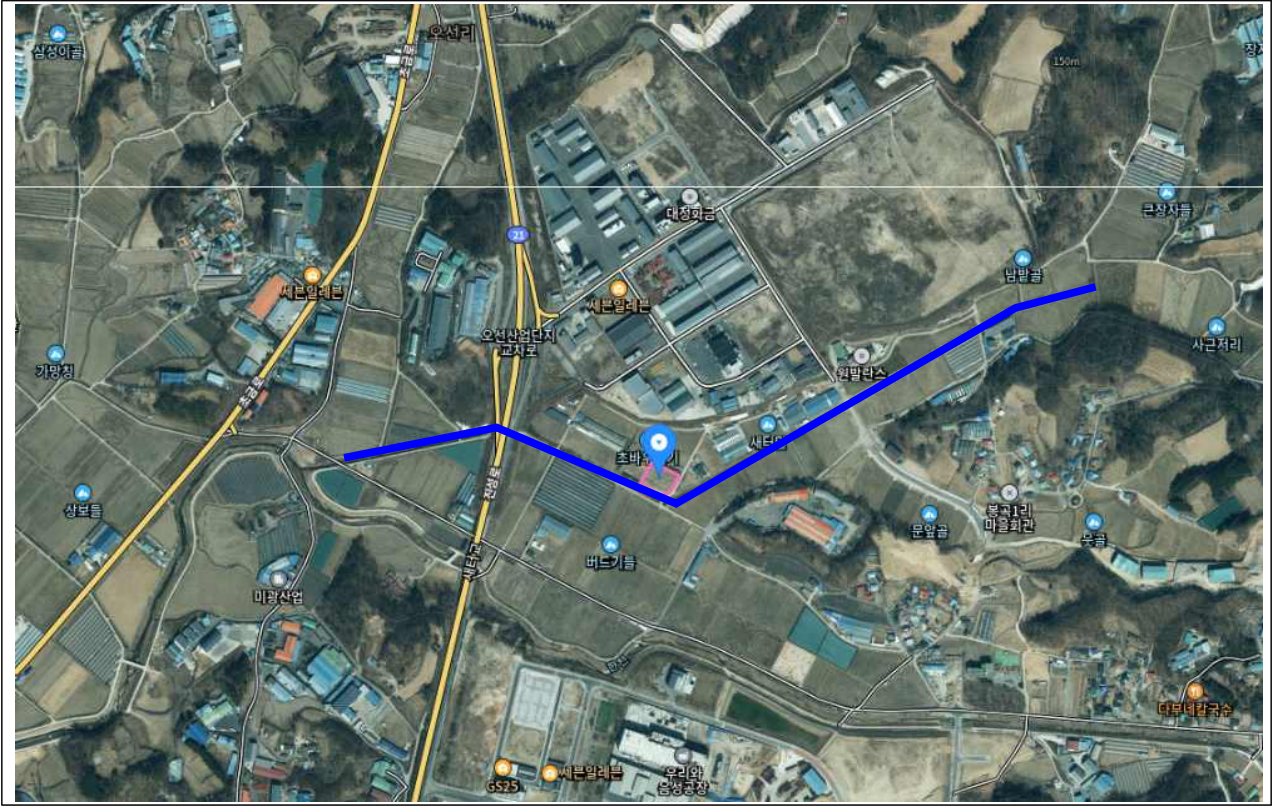


□ 위치도(상우리소하천)

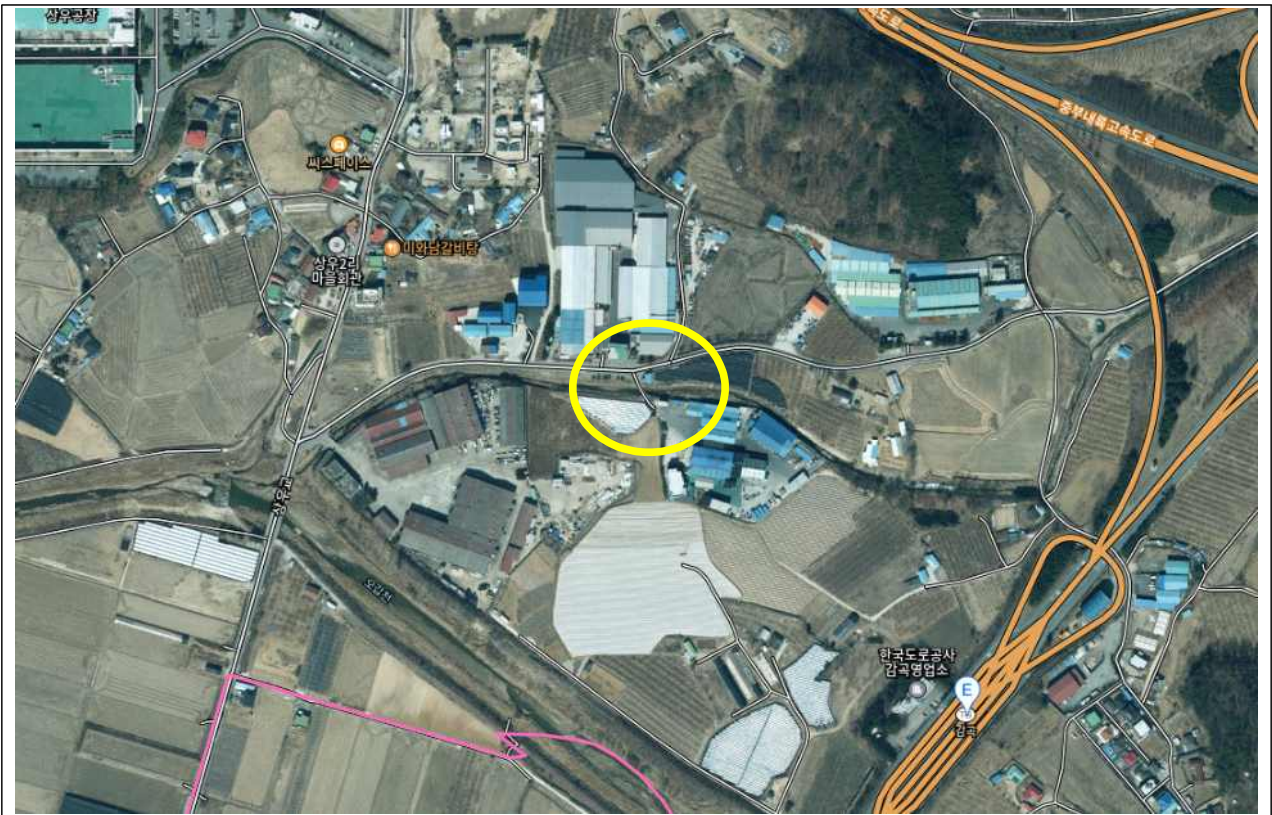

위치도 및 조감도

□ 위치도

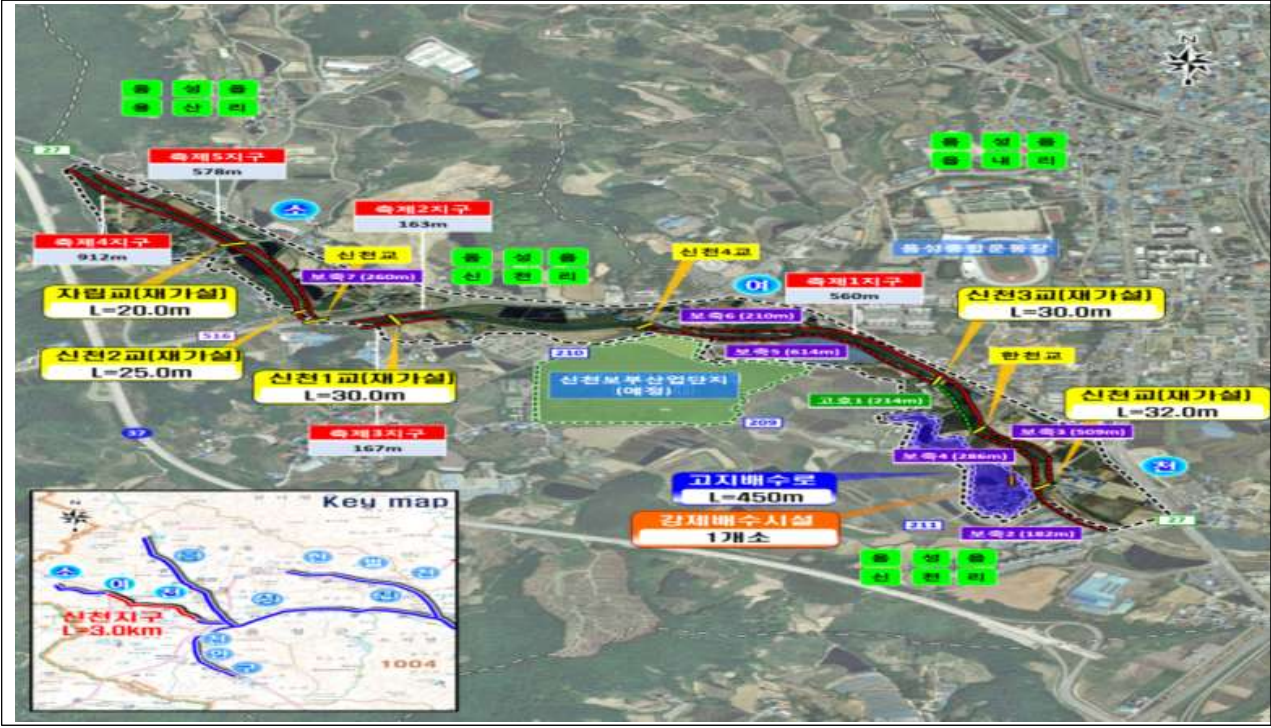


□ 사진 대 지(신천지구)



위치도 및 조감도

□ 위치도

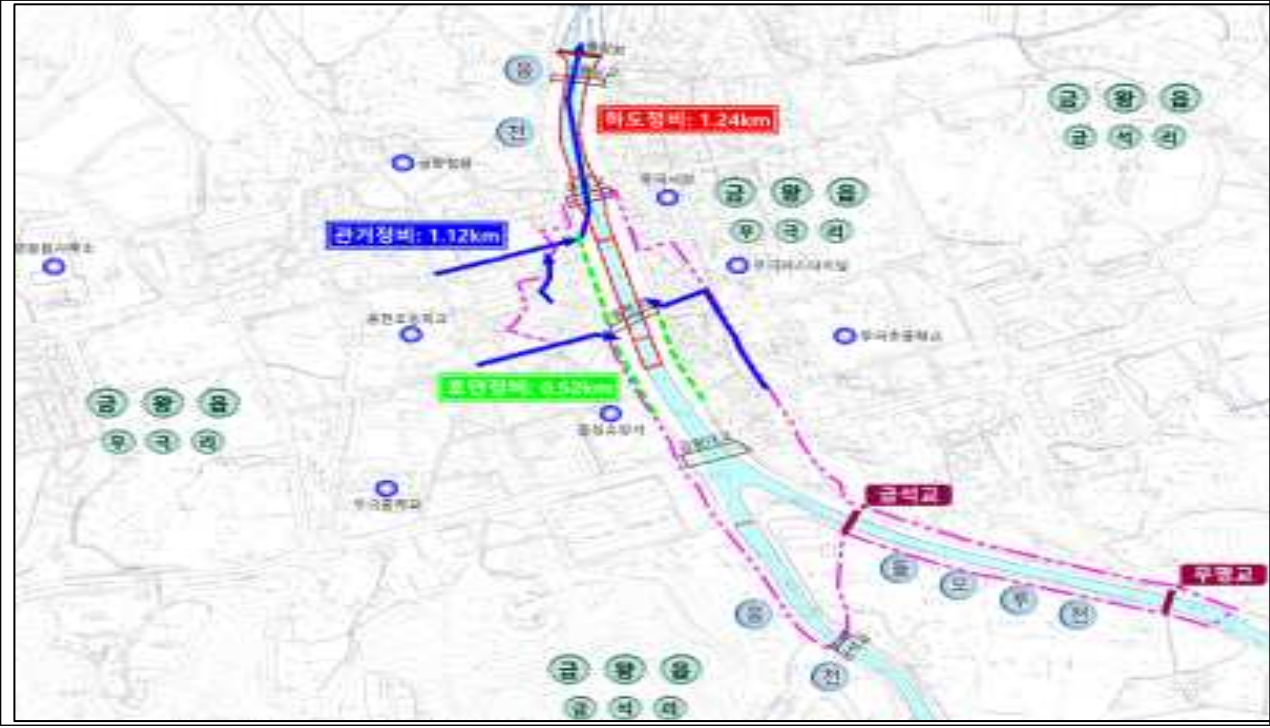


□ 사진 대 지(무곡지구)



위치도 및 조감도

□ 위치도

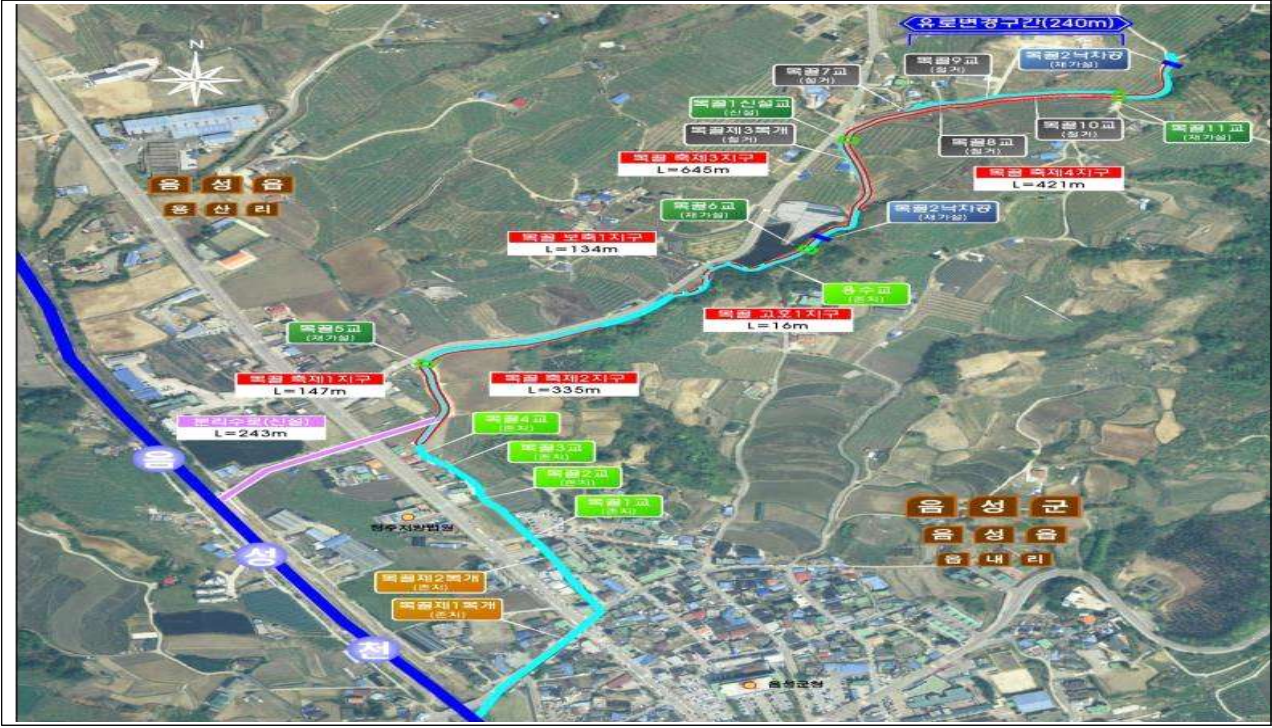


□ 사진 대 지(목골지구)



위치도 및 조감도

□ 위치도

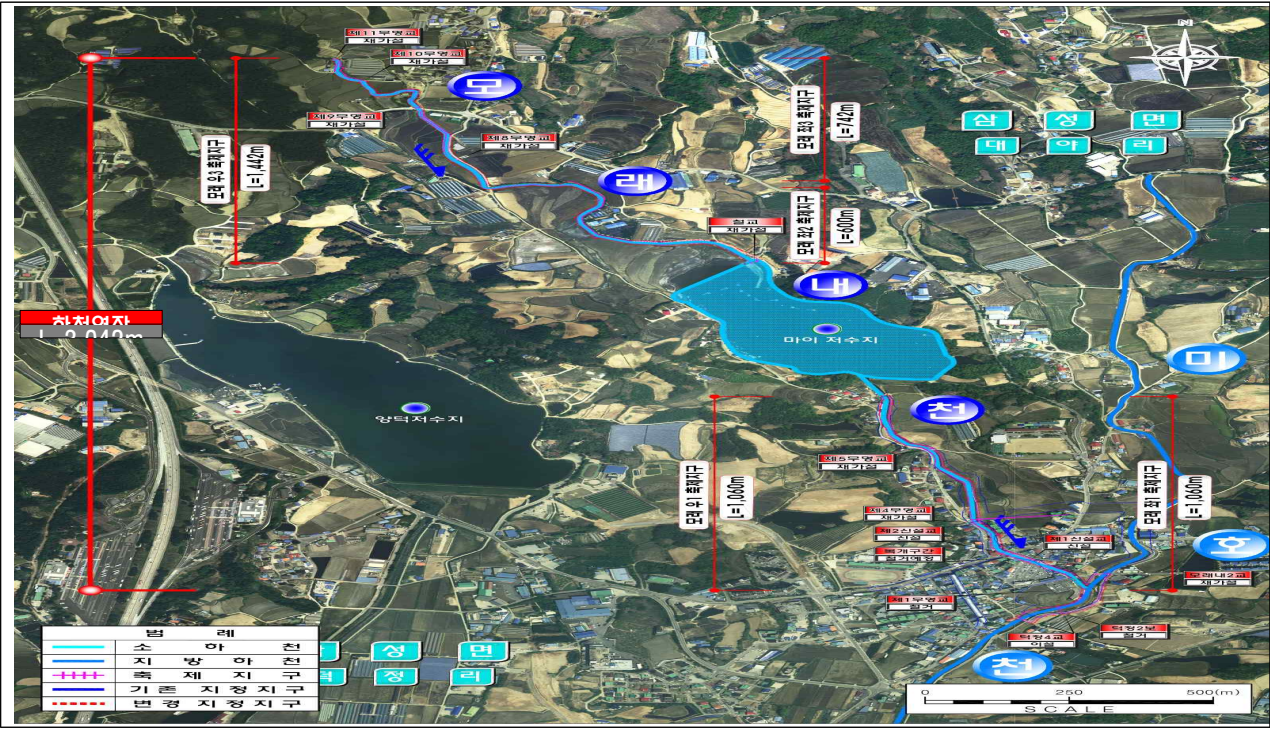

□ 사진대지(모래내지구)



11. 도청 자연재해위험개선지구 정비사업

- ◆ 위치: 음성군 금왕읍 도청리 일원(도청천)
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 규모: 하천정비 L=2.85km, 교량 8개소, 낙차공 5개소 등
- ◆ 총사업비: 15,000백만원 (국 50%, 도 25%, 군 25%)
- ◆ 사업내용: 재해위험요소 해소로 주민의 안전 및 재산 보호
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 추진상황

- 재해위험지역 지정·고시 21. 7. 15.
- 기본 및 실시설계용역 발주 21. 12. 10.
- 기본 및 실시설계용역 착수 22. 3. 7.
- 주민설명회 개최 22. 8. 18.
- 문화재지표조사 및 소규모환경영향평가 용역발주 22. 10. 04.
- 특정공법(신기술·특허) 심의 23. 1. 25.
- 중앙 사전설계검토 심의 23. 4. 28.
- 기술자문위원회 개최 23. 6. 30.
- 실시계획인가 협의 23. 11. 7.
- 공사 발주 24. 6. 17.

□ 향후계획

- 건설관리용역 발주 24. 7.
- 보상업무 추진 24. 7.
- 공사 준공 26. 7.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	15,000	1,940	2,600	5,000	5,460
국 비	7,500	970	1,300	2,500	2,730
도 비	3,750	485	650	1,250	1,365
군 비	3,750	485	650	1,250	1,365

부서/팀	재난안전과 / 재난예방팀	담당자	시설8급 이철환	전화번호	871-3284
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 사진 대지(도청지구)



위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 사진 대지(소석지구)



13. 군민안전통합지원센터 설치 및 운영

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 중앙로 173(본청)
- ◆ 사업기간: 2022 ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 4,360백만원 (군비 100%)
- ◆ 사업내용: 통합관제센터 이전 및 군민안전통합지원센터 설치
안전영상정보처리기기 설치 및 운영
통합지원센터 운영서버 및 저장장치 설치
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 추진상황

- 군청 별관 증축사업 시행 시 군민안전통합지원센터 이전 협의 22. 10.
- 2024 상반기 영상정보처리기기 설치 사업 준공 24. 05.
- 교체설치: 54대
- 2024 통합관제센터 운영서버 및 시스템 고도화 추진 24. 05.
- 비상벨시스템 추가 구축: 23개소

□ 문제점 및 대책

- 통합별관 증축공사 지연에 따른 군민안전통합지원센터 설치 지연
- 통합별관 증축공사 진행사항의 임기 내 추진가능 여부를 고려하여 사업기간 조정 필요

□ 향후계획

- 통합관제센터 이전 및 군민안전통합지원센터 설치 26. 6.(예정)
- 음성군 영상정보처리기기 설치 사업 추진 매년

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2024확보	2025요구	2026이후
합 계	4,360	1,240	200	1,500	1,420
국 비					
도 비					
군 비	4,360	1,240	200	1,500	1,420

부서/팀	재난안전과 / 통합관제팀	담당자	방송통신6급 최종철	전화번호	871-5872
------	---------------	-----	------------	------	----------
