

균형발전국

제347회 임시회

2022. 7. 15. ~ 7. 28.

\*

# 균형개발과

# 목 차

I . 기본현황 .....	3
II . 2022년도 상반기 주요업무 추진실적 .....	5
III . 2022년도 군정 주요 현안 사업 .....	7
1. 농촌협약 .....	7
2. 농촌신활력플러스사업 .....	10
3. 금왕읍 농촌중심지활성화사업 .....	12
4. 감곡면 기초생활거점조성사업 .....	14
5. 지역균형발전 전략사업 추진 .....	16
6. 생극면기초생활거점조성사업 .....	24
7. 축산물공판장 연계도로 개설사업 .....	26
8. 마을만들기사업 .....	28
9. 소규모 주민숙원사업 .....	33
10. 삼성면 복합문화센터 건립 .....	34
11. 음성재해위험개선지구(상습가뭄) 정비사업 .....	36
12. 재해위험저수지 정비사업 .....	38
13. 사창지구 받기반정비사업 .....	39
14. 원당지구 대구획경지정리사업 .....	41

# I. 기본 현황

## 1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀



□ 인 력: 정원 19명 / 현원 18명

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약맞 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	18	18	1	1	5	7	3	1		
농촌활성화팀	8	8	1	1	2	2	1	1		
농촌개발팀	3	3			1	2				
지역개발팀	3	3			1	2				
기반조성팀	4	4			1	1	2			

## 2

## 주요기능

### 농촌활성화팀

- ❖ 농촌협약 계획수립 및 추진
- ❖ 신활력플러스사업 계획수립 및 추진
- ❖ 중복형 농시조성사업
- ❖ 금왕읍농촌중심지활성화사업 및 감곡면 기초생활거점조성사업
- ❖ 농촌공간정비사업 계획수립 및 추진
- ❖ 중간지원조직운영 및 지역역량강화사업

### 농촌개발팀

- ❖ 지역균형발전 전략사업
- ❖ 농촌중심지활성화사업, 기초생활거점조성사업
- ❖ 마을만들기사업
- ❖ 거점지역 기반시설 지원사업
- ❖ 농산어촌개발사업 준공지구 유지관리

### 지역개발팀

- ❖ 소규모 주민숙원사업
- ❖ 소규모시설 유지관리
- ❖ 복지회관 및 마을회관 관리

### 기반조성팀

- ❖ 농업생산기반시설 정비 및 유지관리
- ❖ 한발대비 용수개발, 수해복구사업
- ❖ 농업생산기반시설 인허가

## 3

## 예산규모

□ 일반회계: 31,787백만원(군 예산의 4.16%)

(단위:백만원)

구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감(%)
계	31,787	21,925	9,862(31%)
농촌활성화팀	7,557	3,434	4,123(54.6%)
농촌개발팀	4,295	4,340	△45(△1%)
지역개발팀	9,770	9,395	375(3.8%)
기반조성팀	8,921	4,715	4,206(47.1%)
재무활동	1,200	0	1,200(100%)
행정운영경비	44	41	3(6.8%)

## II. 상반기 주요업무 추진실적

### □ 균형개발과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
농촌협약	정주여건 개선을 위해 협약을 통해 금왕생활권 발전기반 조성	36,610	· 금왕생활권 일반농산어촌개발사업 기본계획수립 용역 착수	10
농촌신활력플러스사업	주민교육을 통한 사회적 경제조직 지원으로 농촌혁신 창출	7,000	· 기본 및 시행계획수립 용역 착수	20
금왕읍 농촌중심지 활성화사업	금왕읍 농촌 발전거점 조성으로 금왕읍 잠재력 개발과 경쟁력 확보	16,000	· 기본 및 시행계획 조건부 승인	30
감곡면 기초생활 거점조성사업	농촌중심지 기능을 보완하면서 중심지 접근이 제한된 배후마을 주민들에게 생활서비스 공급 거점 마련	3,993	· 기본 및 시행계획 승인 · 건축기획 심의	60
농촌공간정비사업 공모사업추진	유해시설을 철거 후 지역경관 개선사업과 주민공동이용 시설 조성	12,000	· 공모사업선정	100
지역균형발전 전략사업 추진	반려동물테마파크 조성 농촌형공공임대주택 산림레포츠 조성 (유아숲놀이터 등)	45,000	· 반려동물테마파크조성 기본구상용역 완료 · 농촌형공공임대주택 수요조사 실시 · 유아숲놀이터 시설설계용역 착수	20
생극면 기초생활 거점조성사업	주민문화복지센터 마을안길 경관개선 웅천수변가로경관정비 다육이광장 조성 등	4,200	· 주민문화복지센터 내부 마감공사 중 · 마을안길 경관개선 도시계획 변경 · 웅천수변가로경관정비 완료 · 다육이광장 조성 관련 협의	70

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
축산물공판장 연계도로 개설사업	군도개설 L=0.67km, B=8.0m	3,000	· 실시계획 수립 중 · 토지 및 지장물 보상 협의	20
마을만들기사업	-기초생활기반확충 -지역역량강화사업	4,500	· 군자리, 동음2리, 삼호1리 - 공사 중	60
			· 한별2리, 주봉3리, 미곡1리 - 사업 착수	10
			· 사정2리, 용계2리, 상우3리 - 기본계획 및 실시설계 용역 중	10
소규모 주민숙원사업	농로포장, 배수로 · 마을안길 정비, 세천 정비 등	2,365	· 현지조사 및 설계 '22. 01. · 공사발주 및 착공 '22. 03.	60
삼성면 복합문화센터 건립	사무실, 상담실, 휴게실, 건강증진실, 프로그램실, 작은 도서관 등	9,400	· 2021 생활SOC복합화사업 선정 '21. 9. · 중복형 농시조성사업 선정 '21. 10. · 공사 발주 및 착공 '21. 10.	15
음성재해위험개선 지구(상습가뭄) 정비사업	관정 및 물탱크 설치 4개소, 송급수관로 5.7km	2,470	· 재해위험지구(상습가뭄) 지정 고시 · 실시설계 · 기본계획수립 · 공사 입찰공고 및 계약 · 보상금 지급	10
재해위험저수지 정비사업	제방 보강 사통 · 복통 정비 여방수로 정비	4,122	· 실시설계 · 공사 착공(장구실, 상곡) · 사전설계검토(용대, 후평)	50
사창지구 받기반정비사업	관정 및 물탱크 설치 4개소, 송배수관로 L=7.51km, 농로포장 L=0.5km	1,688	· 실시설계 · 공사 착공	90
원당지구 대구획경지정리사업	용수로 7.6km, 배수로 5.1km, 도로 1.2km	2,656	· 기본계획수립 · 실시설계	10

# III. 2022년도 주요 현안 사업

## 1. 농촌협약

- ◆ 위 치: 음성군 금왕생활권(금왕읍, 맹동면, 대소면, 삼성면, 생극면)
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2026.
- ◆ 규 모: 농촌협약 1식
- ◆ 총사업비: 36,610백만원 (국비25,622, 지방비10,988)
- ◆ 사업내용: 중심지활성화(대소면, 맹동면), 기초생활거점조성(삼성면), 시군역량강화(금왕생활권), 취약지역개조사업(삼성면)
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2026. 12.

### □ 필 요 성

- 문화·교육·복지 등 서비스 접근성과 정주여건이 열악한 금왕 생활권 농촌중심지를 대상으로 효율적 공간 관리를 통해 난개발 방지는 물론 사람이 돌아오는 농촌 활력도시 조성

### □ 추진상황

- 공모사업 선정 21. 6. 16.
- 농촌협약 대상사업 컨설팅 21. 9. 27. ~
- 기본계획수립 용역 계약 22. 5. 24.

### □ 향후계획

- 농촌협약 체결 22. 7.
- 기본계획 승인 23. 6.
- 시행계획 승인 24. 6.
- 공사 착공 24. 10.
- 공사 준공 26. 12.

### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	36,610	-	1,976	3,430	31,204
국 비	25,622	-	1,383	2,401	21,838
도 비	-	-	-	-	-
군 비	10,988	-	593	1,029	9,366
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌활성화팀	담당자	시설6급 장운용	전화번호	871-3922
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도(대소면)

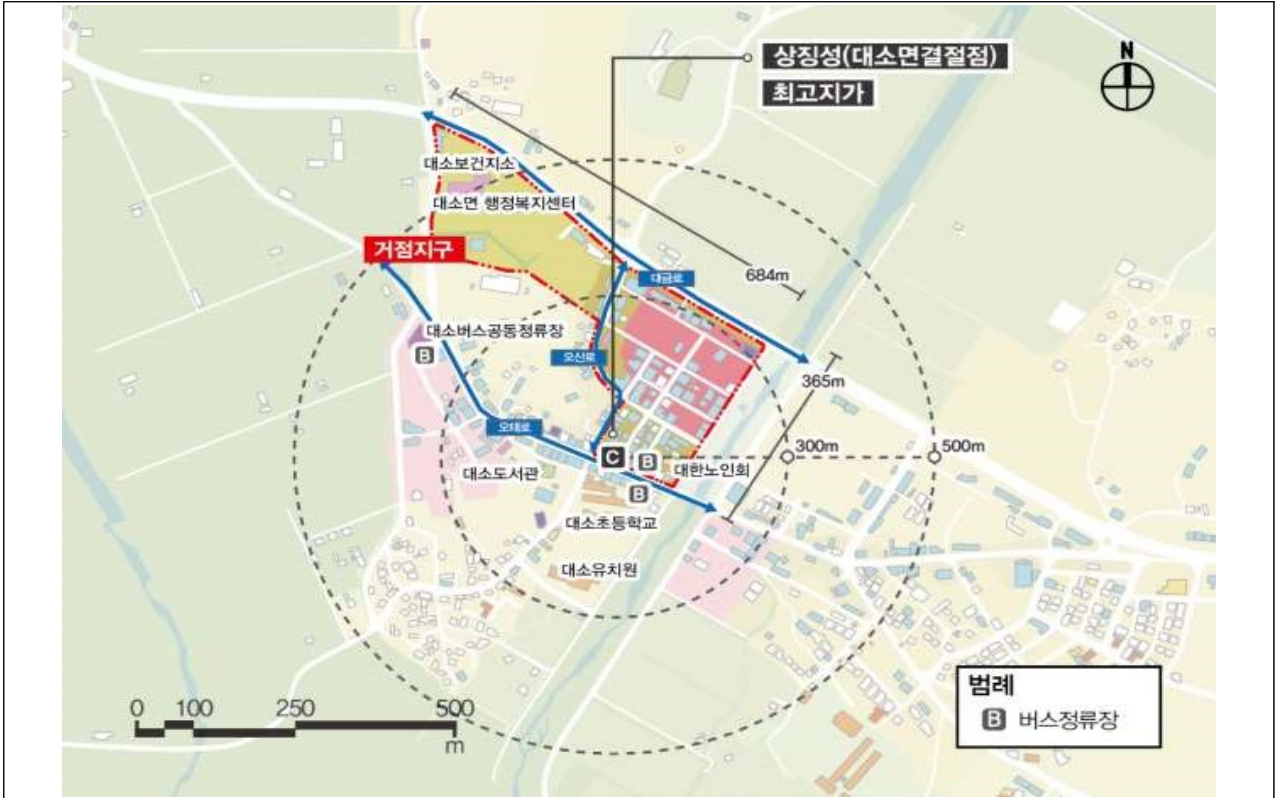

## □ 위치도(삼성면)





# □ 위치도(맹동면)





# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 현장 사진



### 3. 금왕읍 농촌중심지 활성화사업

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 무극리
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 금왕읍 농촌중심지 활성화사업 1식
- ◆ 총사업비: 16,000백만원 (국비11,200, 지방비4,800)
- ◆ 사업내용
  - 정주여건개선(금빛 공감센터 조성, 보행환경정비)
  - 공동체활성화(금빛버스운영, 배후마을정비)
  - 경제활력제고(무극시장 상권정비)
  - 지역역량강화
- ◆ 공정률(이행률): 30%      ◆ 완료시기: 2025. 12.

#### □ 필 요 성

- 금왕읍의 잠재력과 고유의 테마를 살려 농촌중심지 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌 발전거점으로 육성

#### □ 추진상황

- 기본계획 용역 착수 21. 5.

#### □ 향후계획

- 기본계획 승인 22. 7.
- 시행계획 승인 23. 7.
- 공사 착공 23. 10.
- 공사 준공 25. 12.

#### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	16,000	714	1,694	6,224	7,368
국 비	11,200	500	1,186	4,357	5,157
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,800	214	508	1,867	2,211
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌활성화팀	담당자	시설6급 장운용	전화번호	871-3922
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도

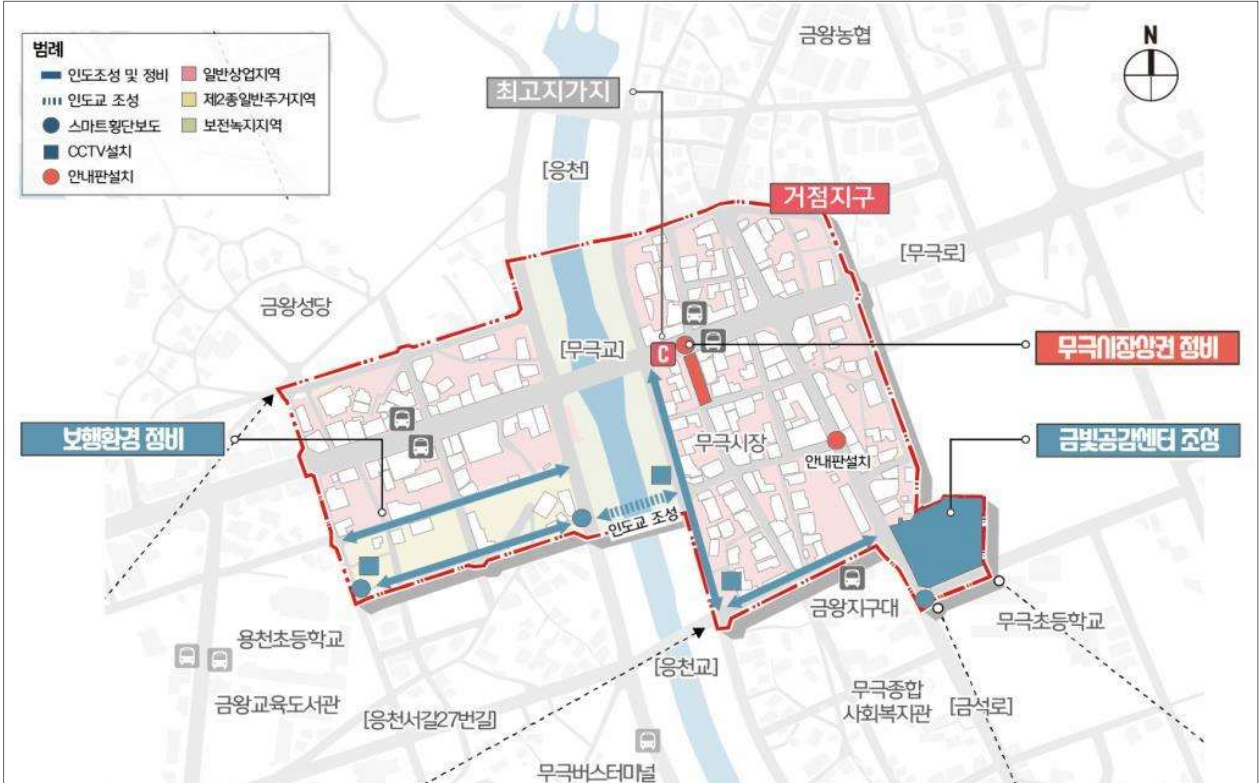

## □ 조감도



## 4. 감곡면 기초생활 거점조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 감곡면 왕장리
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2023.
- ◆ 총사업비: 3,993백만원 (국비2,795, 지방비1,198)
- ◆ 사업내용
  - 기초생활기반확충: 감곡커뮤니티센터 신축, 감곡쉼터 조성
  - 지역역량강화: 주민교육 등
- ◆ 공정률(이행률): 60%      ◆ 완료시기: 2023. 12.

### □ 필 요 성

- 농촌중심지의 기능을 보완하면서 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

### □ 추진상황

- 기본계획 승인 21. 12. 6.
- 건축기획 심의 22. 4. 15.

### □ 향후계획

- 시행계획 승인 23. 1.
- 공사 착공 23. 2.
- 공사 준공 23. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	3,993	1,449	2,143	401	-
국 비	2,795	1,014	1,500	281	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,198	435	643	120	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌활성화팀	담당자	시설7급 강다빈	전화번호	871-3923
------	----------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 현장사진



## 5. 지역균형발전 전략사업 추진

- ◆ 위 치: 음성군 소이면, 원남면, 생극면 일원
- ◆ 사업기간: 2021.~ 2025.
- ◆ 총사업비: 45,000백만원
- ◆ 사업내용
  - 소이면: 반려동물 테마파크 조성
  - 원남면: 농촌형 공공임대주택 조성
  - 생극면: 수레의산 산림레포츠 시설 조성

### □ 필요성

- 상대적 저 발전지역(성장축진지역) 소이면, 원남면, 생극면에 대한 지역균형발전사업을 발굴, 추진하여 음성군 균형발전 도모

### □ 추진상황

- 음성군 지역균형발전 기본계획 수립 19. 11.
- 음성군 균형발전특별회계 설치 19. 11.
- 지역균형발전 전략사업 발굴 용역 시행 20. 3.
- 지역균형발전 전략사업 발굴 용역 준공 20. 11.
- 지역균형발전 전략사업 자체 발굴 21. 5.
- 지역균형발전 전략사업 확정(마중물 사업) 21. 7.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	45,000	160	2,000	2,000	40,840
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	45,000	160	2,000	2,000	40,840
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	행정7급 강종섭	전화번호	871-5462
------	---------------	-----	----------	------	----------



## 5-① 소이면 반려동물 테마파크 조성

- ◆ 위 치: 소이면 충도리 산 135-2(충도저수지 일원)
- ◆ 사업기간: 2021.~ 2025.
- ◆ 규 모: 반려동물 테마파크 조성
- ◆ 총사업비: 50억+  $\alpha$  (민자 사업, 군비 50억원)
- ◆ 사업내용
  - 반려동물 운동장, 반려동물 동반카페, 유기견 보호센터 등 반려동물 관련시설을 민자 사업으로 조성
  - 군에서는 관련 용역 및 기반시설 조성(진입도로 등) 지원
- \* 공감소통의 날 운영 시 지역주민 건의사업(2021. 3. 24.)

### □ 추진상황

- 지역균형발전 전략사업 확정 21. 7. 28.
- 타시군 추진사례 파악 및 용역 검토 21. 8.~
- 기본구상 용역 착수 21. 10.
- 기본구상 용역 착수보고회 21. 12.
- 충도리 주민대상 사업간담회 21. 12.
- 기본구상 용역 주민설명회 개최 22. 4.
- ※ 주민반대 의견(충도1리장 조봉 외)
- 기본구상 용역 준공 22. 5.

### □ 향후계획

- 충도리 주민대상 사업간담회 22. 8.
- 타시군 벤치마킹 22. 8.
- 타당성조사 용역 22. 8.~ 22. 12.
- 민간 사업자 공모 23. 1.~ 23. 6.
- 기본계획 및 실시설계 수립 용역 23. 7.~
- 착공 및 준공 24. 7.~ 25. 12.

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	행정7급 강종섭	전화번호	871-5462
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 계획(안)

## □ 위치도



## □ 기본구상용역(안)



※ 개략사업비: 총 285억(공사비 230억, 용역비 15억, 토지비 20억, 진입도로 공사 20억)

# □ 배치계획(안)



## 5-② 원남면 농촌형 공공임대주택 조성

- ◆ 위 치: 원남면 보천리 일원
- ◆ 사업기간: 2023.~ 2024.
- ◆ 규 모: 농촌형 공공임대주택단지 조성
- ◆ 총사업비: 60억(사업비: LH 80%, 군비 20% / 운영비: LH 70%, 군비 30%)
- ◆ 사업내용
  - 공공임대주택 조성 19호(주거플랫폼 형태)
  - 주민복지시설(공동커뮤니티센터) 1동(군비 추진)

### □ 추진상황

- 지역균형발전 전략사업 확정(마중물 사업) 21. 7.
- LH 충북지역본부 방문 21. 8.
- 타 시군 벤치마킹(전남 보성군, 강진군) 21. 8.
- 대상지 선정을 위한 단체장 회의 21. 10.
- LH 충북지역본부 사업 연계가능 협의 22. 3. ~ 4.
- 수요조사 실시 22. 6. ~


### □ 향후계획

- 농촌형 공공임대주택 수요조사 완료 22. 7.
- LH에 주거플랫폼 사업 제안 및 요청 22. 8.
- 입지, 수요, 부지확보 가능성 등 검토 22. 8. ~ 9.
- 타 시군 벤치마킹(괴산군, 영동군) 22. 9.
- LH와 주거플랫폼 기본협약(MOU) 체결 22. 10.
- 대상지 결정 및 부지 협의매수 23. 1. ~
- 착공 24. 1. ~
- 준공 24. 12. ~

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 사업예시

## □ 위치도

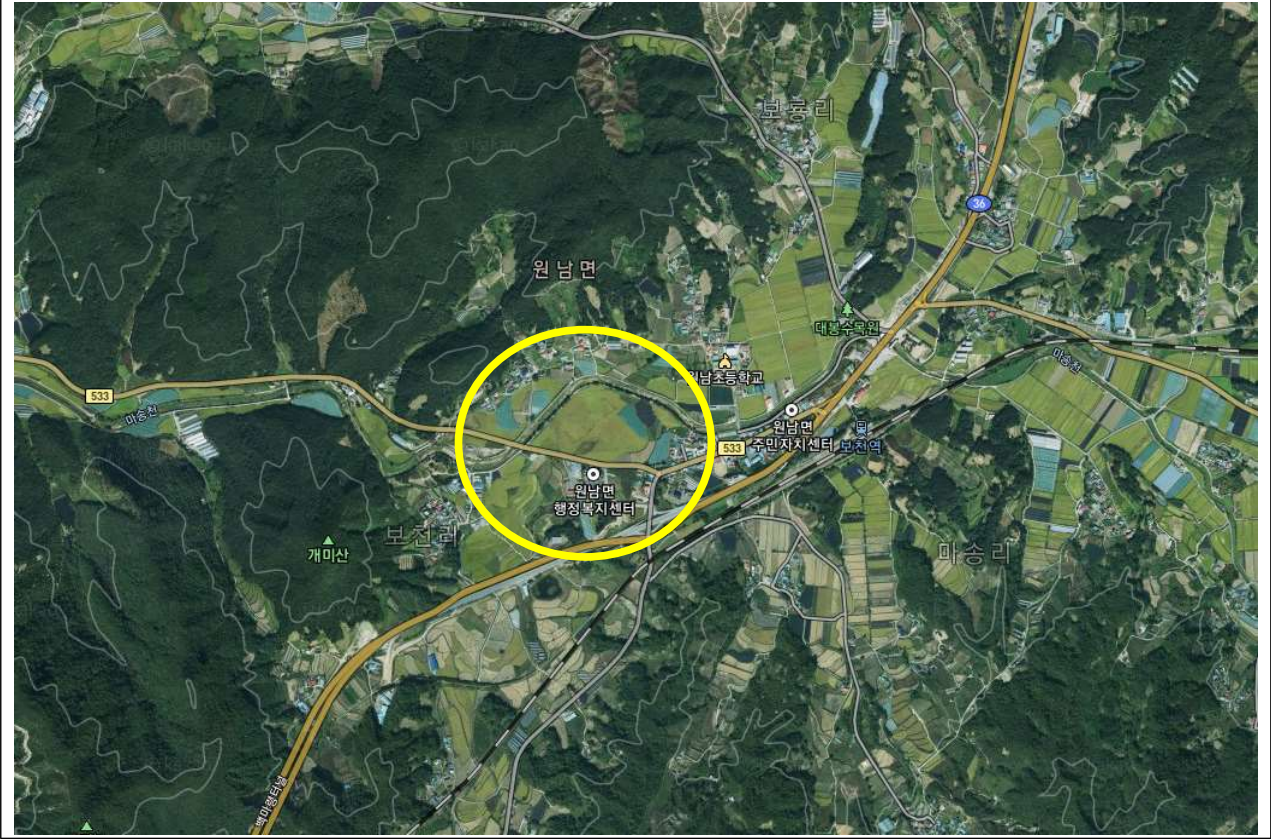

## □ 사업 예시



## 5-③ 생극면 산림레포츠 시설 조성

- ◆ 위 치: 생극면 차곡리 일원(군유지)
- ◆ 사업기간: 2021.~ 2025.
- ◆ 규 모: 청소년 체험의 숲 1개소, 유아 숲 놀이터 1개소
- ◆ 총사업비: 50억원
- ◆ 사업내용
  - 청소년 체험의 숲 조성(5,000㎡) 유아 숲 놀이터 1식
  - 청소년수련원, 수레의산 휴양림, 오토캠핑장과 연계 사업

### □ 추진상황

- 지역균형발전 전략사업 확정(마중물 사업) 21. 7.
- 유아숲 놀이터 실시설계용역 착수 22. 4.


### □ 향후계획

- 청소년 체험의 숲 기본설계용역 발주 22. 8.
- 유아 숲 놀이터 실시설계 용역 준공 22. 10.
- 유아 숲 놀이터 착공 23. 1.
- 청소년 체험의 숲 사업 신청(도이양) 23. 3.
- 유아 숲 놀이터 준공 23. 6.

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 사업 예시

## □ 위치도

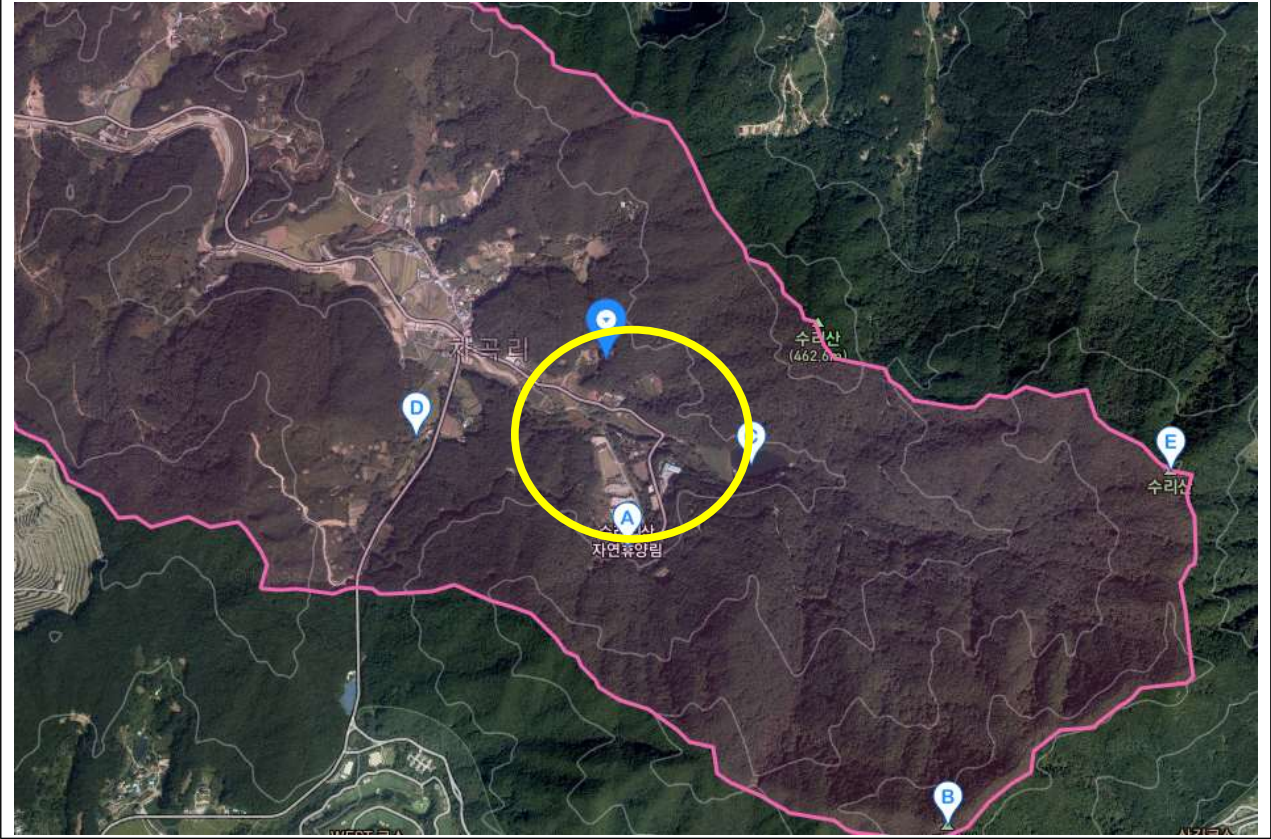

## □ 사업 예시



## 6. 생극면 기초생활 거점조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 생극면 신양리 445-3번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2022.
- ◆ 총사업비: 4,200백만원(국비2,800, 지방비1,400)
- ◆ 사업내용
  - 기초생활기반확충:  
주민문화복지센터조성,마을안길경관개선,응천수변가로경관정비,  
다육이 광장 조성 등
  - 지역역량강화: 주민교육 등

### □ 필요성

- 농촌중심지의 기능을 보완하면서 농촌중심지 접근이 상대적으로 제한된 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

### □ 추진상황

- 기본계획 승인 20. 3.
- 시행계획 승인 21. 7.
- 시설공사 착공 21. 9.

### □ 향후계획

- 시행계획 변경 22. 7.
- 추진위원회 개최 22. 8.
- 시설공사 준공 22. 12.
- 시설물 인계 22. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	4,200	3,840	360	-	-
국 비	2,800	2,688	112	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,400	1,152	248	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------



# 위치도 및 조감도

## □ 조 감 도



## □ 종합계획도

### 음성군 생극면 기초생활거점 육성사업 종합계획도

**[사업의 개요]**

- ▶ 위치 : 충청북도 음성군 생극면 신항리 일원
- ▶ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 ( 4년간 )
- ▶ 사업비 : 4,000 백만원

**[세부사업계획]**

**기초생활거점육성**

① 주민문화복지센터 조성

- 위치 : 신항리 445-3 외 1필지
- 규모 : 4,428㎡(문화센터 신축 A=730㎡, 배양관: 주차20㎡)

**지역환경개선**

② 도로 정화거리 조성

- 위치 : 신항리 444-4, 445-4, 445-5 외 3필지
- 규모 : 604㎡ (C)국유지 A=300㎡, 교통정 A=104㎡

③ 마을민길 경관개선

- 위치 : 신항리 마을안길 일원
- 규모 : L=245m (아스콘재포설 및 보행도로 개설)

④ 읍천 수변가로 경관정비

- 위치 : 신항리 860 외 7필지
- 규모 : L=700m
- 복면층 : 21개소 / 로프데크 : 5개소
- 횡단차 : 4개소

1 주민문화복지센터 조성

2 도로 정화거리 조성

3 읍천 수변가로 (로프데크) 조성

4 마을민길 (보행도로) 개설

## 7. 축산물공판장 연계도로 개설사업

- ◆ 위 치: 음성군 대소면 오류리~ 삼성면 청룡리 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 14,751㎡
- ◆ 총사업비: 3,000백만원(도비90%, 군비10%)
- ◆ 사업내용: 도로개설 L=0.67km, B=8.0m

### □ 필 요 성

- 축산물공판장과 축산물유통단지의 연계도로를 개설하여 기존산업단지 및 공판장의 교통량 분산을 유도하고, 유통단지 및 공판장을 활성화 하여 중부권 축산물 유통 중심지로 조성하여 지역경제 활성화

### □ 추진상황

- 충청북도 거점육성형 지역개발계획 고시 19. 1.
- 실시설계 용역 착수 20. 6.
- 지역개발사업 구역지정 승인 21. 11.
- 보상계획 열람 공고 21. 11.

### □ 향후계획

- 토지보상금 지급 22. 6. 30. ~ 22. 12. 31.
- 실시계획 승인(사업기한 연장 등) 22. 9.
- 공사착공 및 준공 23. 1. ~ 23. 12.

### □ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	3,000	978	400	1,622	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	2,700	880	360	1,460	-
군 비	300	98	40	162	-
민 간	-	-	-	-	-


부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-5463
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도

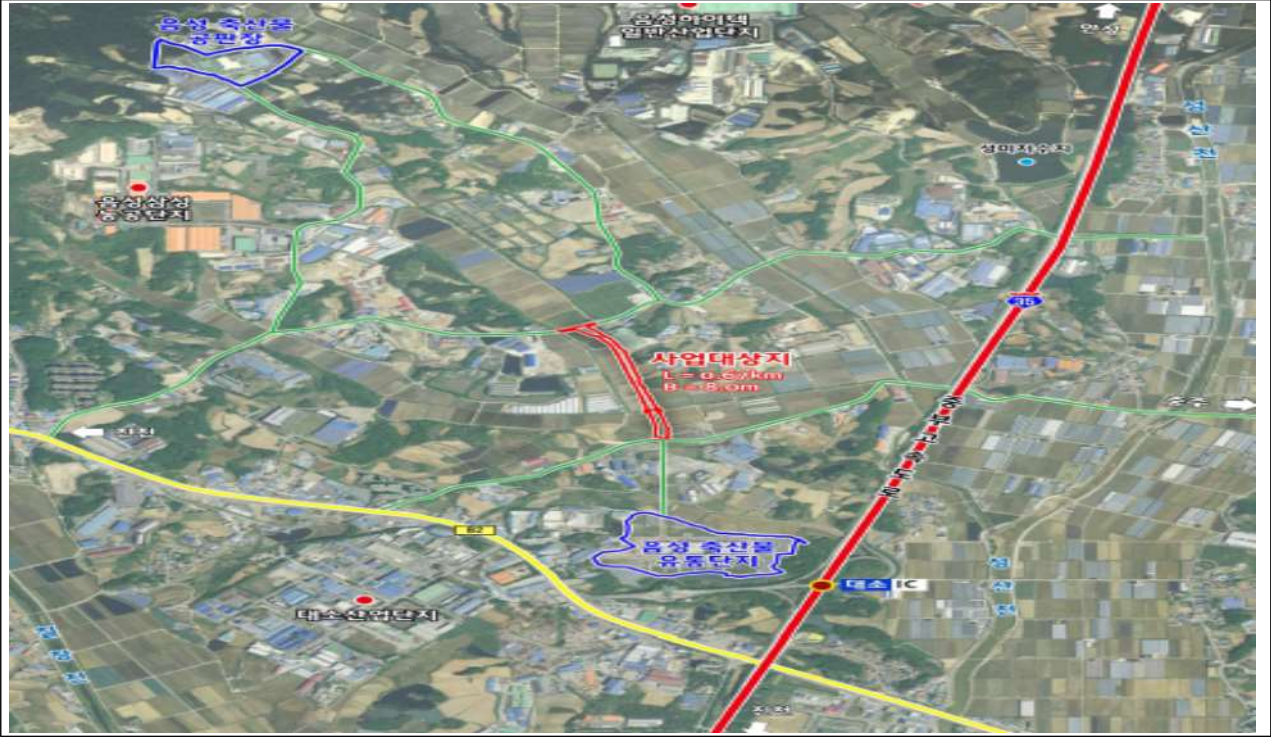

## □ 사업계획도

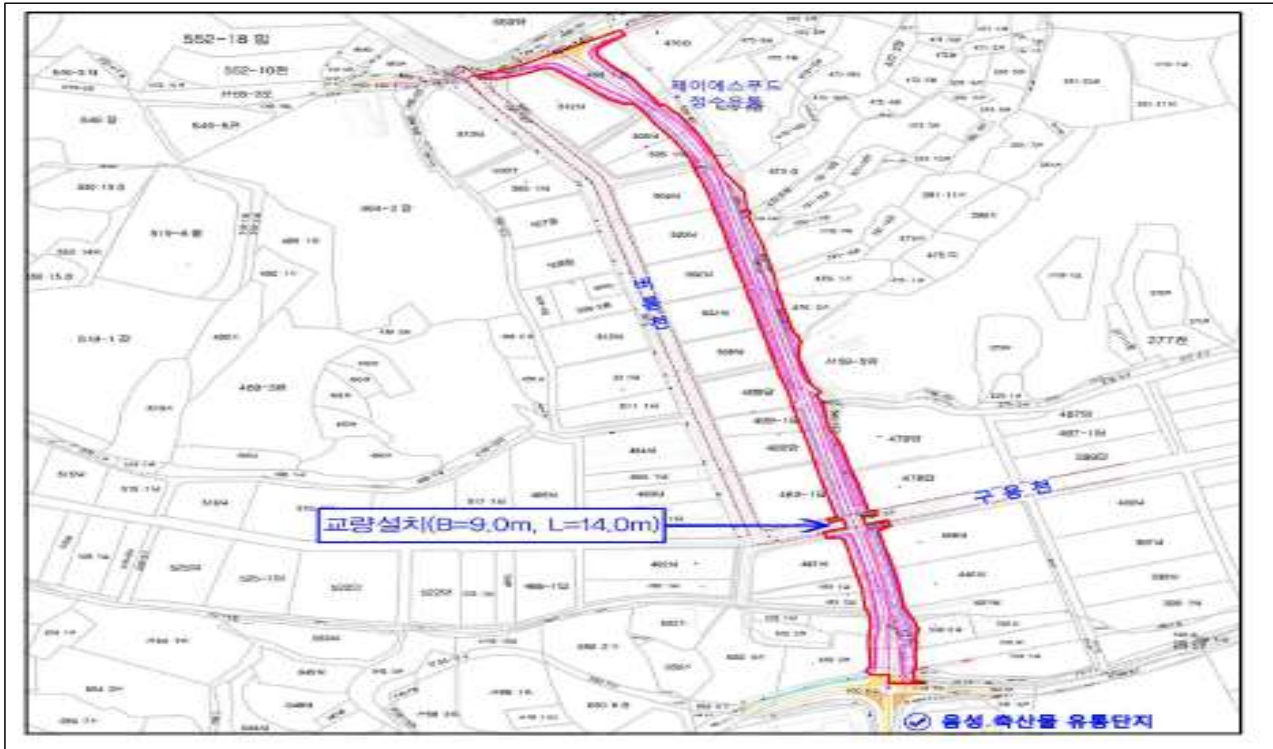

## 8. 마을만들기사업

- ◆ 위 치: 음성읍(동음2리, 한별2리, 사정2리), 대소면(미곡1리, 삼호1리), 맹동면 군자리, 원남면 주봉3리, 금왕읍 용계2리, 감곡면 상우3리 일원
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2024.
- ◆ 총사업비: 4,500백만원(지방비100%), 마을당 5억원(9개마을)
- ◆ 사업내용
  - 기초생활기반확충: 마을회관 리모델링, 공동급식센터 신축, 쉼터조성 등
  - 지역역량강화: 컨설팅, 선진지 견학, 맞춤형교육, 사업지원 등

### □ 필 요 성

- 마을의 기초생활기반 확충 및 주민이 참여하는 교육 등을 통하여 주민의 생활 만족도를 높이고 정주여건 개선

### □ 추진상황

- 음성읍(동음2리), 대소면(삼호1리), 맹동면(군자리) (20년지구)
  - 공사 중 21. 7.~
- 음성읍(한별2리), 대소면(미곡1리), 원남면(주봉3리) (21년지구)
  - 공사 착공 22. 5. ~ 22. 6.
- 음성읍(사정2리), 금왕읍(용계2리), 감곡면(상우3리) (22년지구)
  - 기본계획 및 실시설계 수립 중 22. 3. ~ 22. 12.

### □ 향후계획

- 음성읍(동음2리), 대소면(삼호1리), 맹동면(군자리) (20년지구)
  - 공사 준공 22. 12.
- 음성읍(한별2리), 대소면(미곡1리), 원남면(주봉3리) (21년지구)
  - 지역역량강화사업 용역 발주 22. 7.
  - 공사 준공 23. 12.
- 음성읍(사정2리), 금왕읍(용계2리), 감곡면(상우3리) (22년지구)
  - 기본계획 및 시행계획 수립 22. 12.
  - 공사 착공 23. 1.
  - 공사 준공 24. 12.

## □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	4,500	1,402	1,477	1,321	300
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,500	1,402	1,477	1,321	300
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 농촌개발팀	담당자	시설9급 노태형	전화번호	871-5464
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



사진설명 | 동음2리(꽃창골) 마을만들기 사업

## □ 위치도




사진설명 | 삼호1리(쇠머리) 마을만들기 사업

□ 위치도



사진설명	군자리 마을만들기사업
------	-------------

□ 위치도

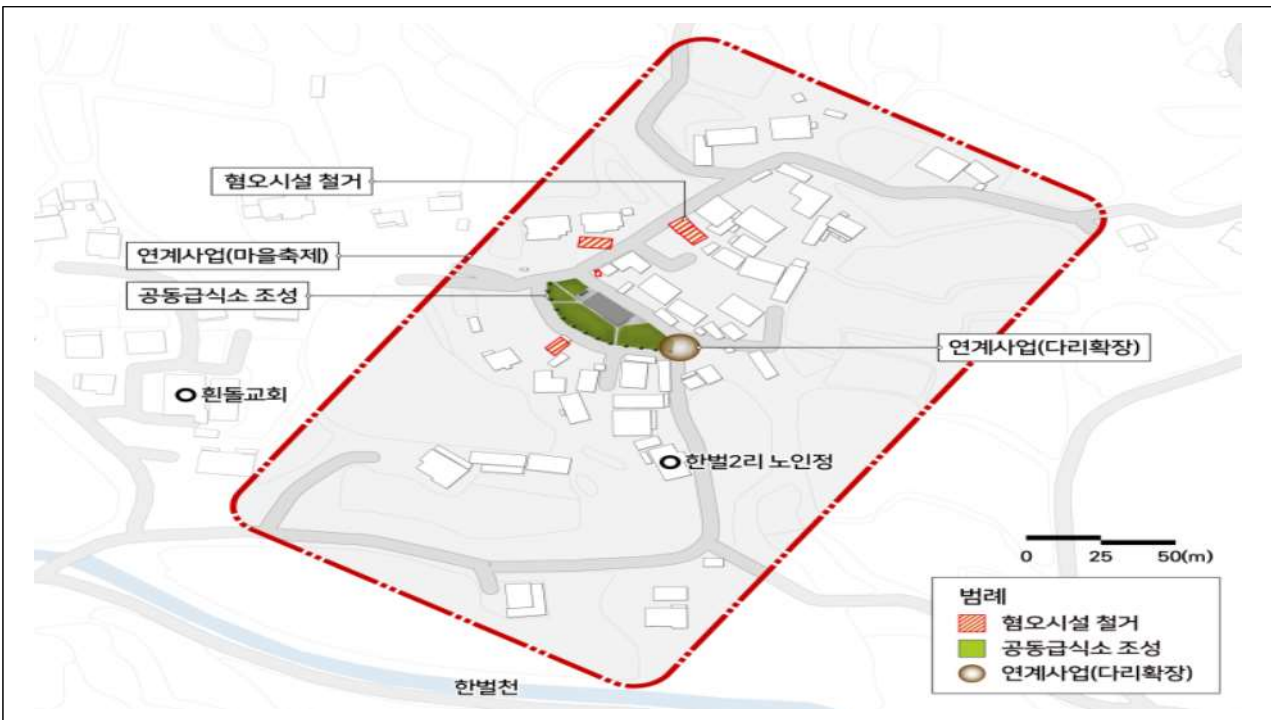

사진설명	한별2리(낚은터) 마을만들기 사업
------	--------------------

# □ 위치도



사진설명

미곡1리(온새미) 마을만들기사업

# □ 위치도



사진설명

주봉3리(서당골) 마을만들기 사업



## 9. 소규모 주민숙원사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- ◆ 총사업비: 2,365백만원 (군비100%)
- ◆ 사업내용: 농로포장, 배수로·마을안길정비, 세천정비 등
- ◆ 공정률(이행률): 60%
- ◆ 완료시기: 2022. 12.

### □ 필요성

- 군민의 오랜 숙원사업 해결로 주민불편 해소
- 소규모 기반시설 확충으로 마을주민의 정주여건 개선

### □ 추진상황

- 현장 조사 및 설계 22. 1.
- 공사발주 및 착공 22. 3.
- 공사 준공 (본예산) 22. 6.

### □ 향후계획

- 제1회 추가경정 예산 확보 22. 7.
- 공사 설계, 발주 및 착공 22. 9.
- 공사 준공 (추가경정 예산) 22. 12.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	2,365	-	2,365	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,365	-	2,365	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 지역개발팀	담당자	시설7급 유영선	전화번호	871-3972
------	---------------	-----	----------	------	----------

## 10. 삼성면 복합문화센터 건립

- ◆ 위치: 음성군 삼성면 덕정리 540-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2023.
- ◆ 총사업비: 9,400백만원 (국비1,012, 도비956, 군비7,432)
- ◆ 사업량: 부지면적 3,187㎡ / 연면적 3,213㎡(지하1층, 지상3층)
- ◆ 사업내용: 사무실, 상담실, 휴게실, 건강증진실, 프로그램실, 작은도서관 등
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2023. 3.

### □ 필요성

- 다양한 계층의 복지수요 충족 및 지역복지체계 확립
- 맞춤형 문화복지시설 공급을 통해 군민의 삶의 질 향상에 기여

### □ 추진상황

- 2021 생활SOC복합화사업 선정 20. 9.
- 충북형 농시(農市)조성사업 선정 20. 10.
- 공사 착공 21. 10.
- 선진지 견학 (경기도 고양시) 22. 5.
- 가시설(휴막이) 공사 22. 6.

### □ 향후계획

- 지하층 골조공사 22. 7.
- 건축 철골 및 철근콘크리트 공사 22. 9.
- 준공 및 개관 23. 3.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	9,400	5,226	4,174	-	-
국 비	1,012	110	902	-	-
도 비	956	956	-	-	-
군 비	7,432	4,160	3,272	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	균형개발과 / 지역개발팀	담당자	시설7급 유영선	전화번호	871-3972
------	---------------	-----	----------	------	----------

# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 조감도






# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도

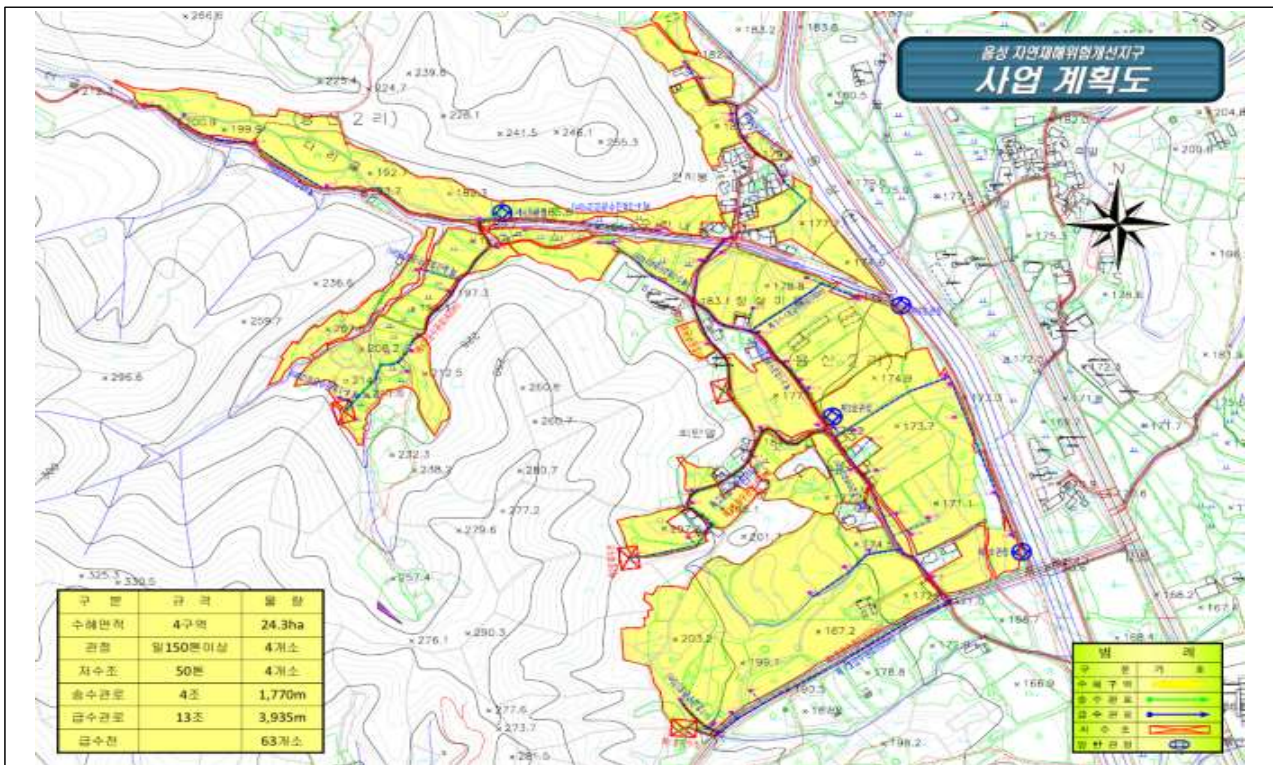

## 12. 재해위험저수지 정비사업

- ◆ 위 치: 음성군 소이면 후미리, 비산리, 삼성면 상곡리, 용대리
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2022.
- ◆ 규 모: 44ha
- ◆ 총사업비: 4,122백만원 (국비2,061, 지방비2,061)
- ◆ 사업내용: 제방 보강(L=647m), 사통·복통 설치 각 1식
- ◆ 공정률(이행률): 50%                      ◆ 완료시기: 2022. 12.

### □ 필 요 성

- 자연재해로 인한 안전사고 예방 및 선제적 위험요소 차단
- 안정적인 농업용수 공급을 통한 영농편의 제공

### □ 추진상황

- 실시설계(장구실) 20. 1. 15.
- 실시설계(상곡, 용대, 후평) 21. 1. 15.
- 공사 착공(장구실)(공정률 95%) 21. 3. 31.
- 공사 착공(상곡)(공정률 90%) 21. 11. 23.
- 사전설계검토(용대, 후평) 22. 5. 2.

### □ 향후계획

- 공사 준공(장구실) 22. 7.
- 공사 착공(용대, 후평) 22. 8.

### □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	4,122	772	3,350	-	-
국 비	1,961	388	1,573	-	-
도 비	588.3	116.4	471.9	-	-
군 비	1,572.7	267.6	1,305.1	-	-

부서/팀	균형개발과 / 기반조성팀	담당자	시설8급 최성엽	전화번호	871-3983
------	---------------	-----	----------	------	----------




# 위치도 및 조감도

## □ 위치도



## □ 계획도

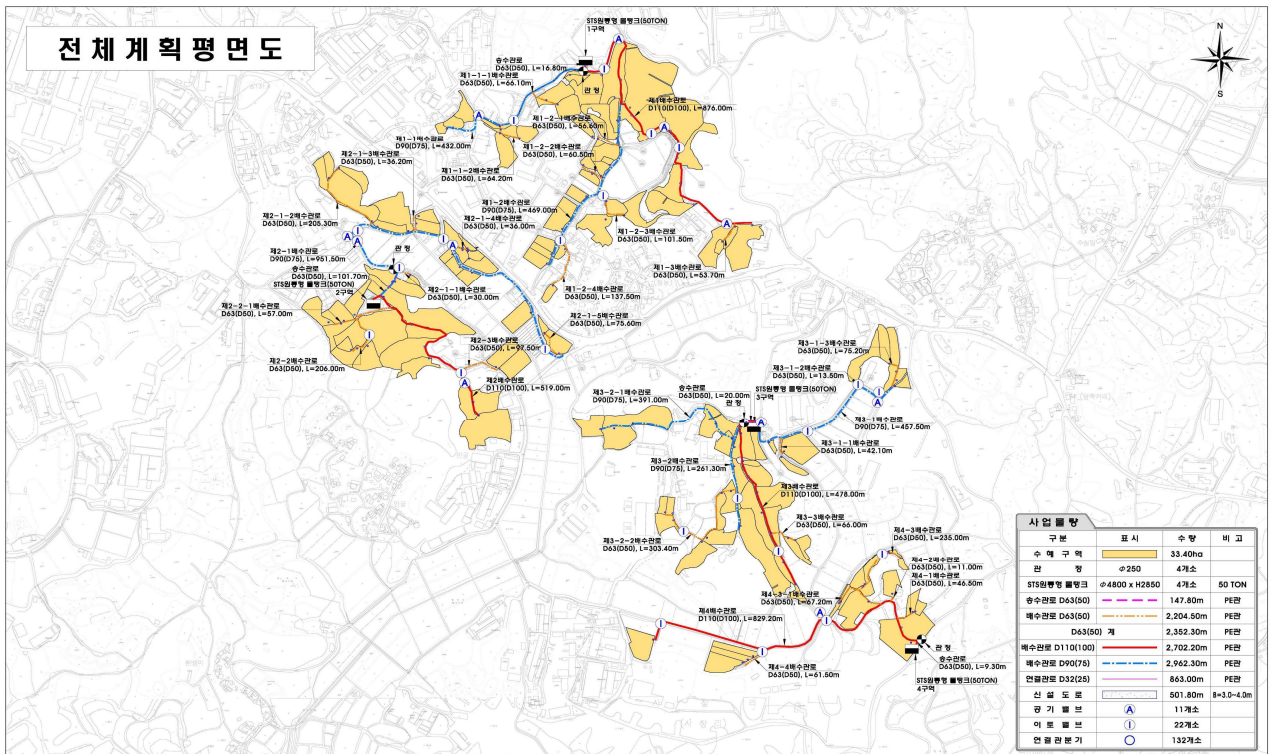





# 위치도 및 조감도

## □ 위치도

