

경제산업국

제347회 임시회

2022. 7. 15. ~ 7. 28.

*

산림복지과


목 차

I . 기본현황	3
II . 2022년도 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 2022년도 군정 주요 현안 사업	7
1. 선도 산림경영단지 조성사업	7
2. 봉학골 지방정원 조성사업	9
3. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업	11
4. 미세먼지 차단숲 조성사업	13
5. 금왕 용담산 근린공원 조성사업	15
6. 대소 망가래 근린공원 조성사업	17
7. 용계저수지 둘레길 조성사업	19
8. 무궁화 동산 조성사업	21
9. 복지시설나눔숲 조성사업(녹색자금 지원사업)	23
10. 사정저수지 경관조성사업	25
11. 쾌적한 도시경관 조성사업	27
12. 도시공원 및 녹지대 유지관리 사업	29
13. 맹동 치유의 숲 조성사업	31
14. 백야자연휴양림 보완사업	33
15. 금봉산 탐방로 조성사업	35

I. 기본 현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀

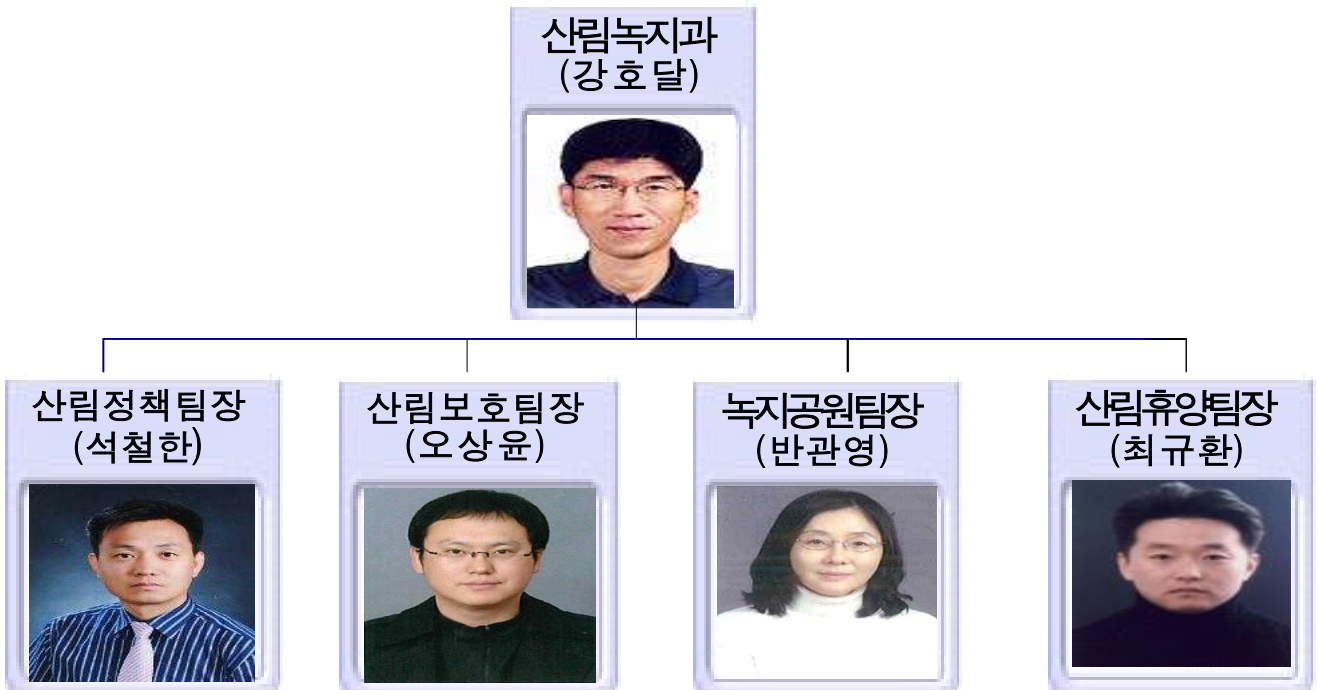

□ 인 력: 정원 24명, 현원 23명, 정원 외 인력 12명

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약직 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	35	23	-	1	6	5	7	4	6	6
산림정책팀	7	7	-	1	1	2	2	1	-	-
산림보호팀	7	5	-	-	1	1	2	1	-	2
녹지공원팀	8	6	-	-	2	1	2	1	-	2
산림휴양팀	13	5	-	-	2	1	1	1	6	2

※ 정원외 인력: 무기계약직 4명/ 청원경찰 2명/ 청원산림보호직원 4명/ 임기제 2명

2

주요기능

산림정책팀

- ❖ 조림 및 숲 가꾸기 사업
- ❖ 산지전용허가, 협의, 신고

산림보호팀

- ❖ 산불방지대책 추진 및 산림병해충 방제
- ❖ 임도시설 사업 및 균유림 업무 추진

녹지공원팀

- ❖ 도시숲, 숲길(등산로·둘레길) 조성사업
- ❖ 도시공원 및 녹지관리(점용, 허가)
- ❖ 지방정원 조성 및 녹색자금 지원사업

산림휴양팀

- ❖ 산림휴양시설 조성·관리
- ❖ 목재문화체험장 및 국민여가캠핑장 조성·관리
- ❖ 수목원 및 자생식물원 조성·관리

3

예산규모

일반회계: 27,308백만원(군 예산의 3.57%)

(단위:백만원)

구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감(%)
계	27,308	18,944	8,364(44%)
산 립 정 책 팀	3382	4993	△1,611(△32%)
산 립 보 호 팀	3983	3424	559(16%)
녹 지 공 원 팀	14,135	7661	6,474(85%)
산 립 휴 양 팀	5774	2835	2,939(104%)
행 정 운 영 경 비	34	31	3(10%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 산림녹지과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
조림 및 숲가꾸기사업	· 조림사업 130ha · 숲가꾸기 사업 880ha	2,175	· 춘기 조림사업 완료(130ha) · 조림지사후관리,산불예방숲가꾸기 실시설계 완료(317ha) · 조림지사후관리(풀베기) 실시(1회베기 완료, 483ha)	60
선도 산림경영단지 조성사업	· 산림기본계획 수립 · 숲가꾸기사업 시행 및 산림경영계획 수립	7,500	· 음성군산림조합과 MOU 체결 · 경영단지 산림기본계획 용역 착수 · 운영협의회 구성 및 제1회 개최 · 경영단지 산림경영계획 용역 착수	5
임도 조성관리	· 임도신설 4.3km · 임도보수사업 6.00km	1,083	· 간선임도 시설 2.5km 신설	30
보호수 관리	· 보호수 정비 사업	73	· 보호수(노거수) 정비작업(1차, 2차) 완료	80
공유재산 관리(공유임야)	· 공유림 관리 및 실태조사	67	· 공유림 재해우려지 정비사업 · 공유재산 실태조사 용역 시행	50
산림 돌발해충 (솔잎혹파리류) 방제	· 돌발해충(솔잎혹파리류) 방제 수단주사 실시	238	· 산림병해충 예찰 방제단 4인 · 장비(방제차량 4대, 유아등 11대, 페로몬 트랩 60대)운영	50
봉학골 지방정원 조성 사업	· 방문객센터, 주차장 · 주제정원(11개), 가드너 교육센터 등	10,500	· 조성사업 착공(20.5.) · 조성사업 1차 준공(21.5.) · 조성사업 2차 준공(22.6.) · 조성사업 총차준공예정(23.5.)	50
봉학골 산림레포츠단지 조성사업	· 모험·체험시설 4종 산림레포츠시설 · 순환산책로 및 휴게 시설	5,800	· 기본설계용역 착공(22.3.) · 기본설계용역 준공예정(22.11.)	5
미세먼지 차단 숲 조성사업	· 차단숲 A=1.0ha · 수목 및 초화류 식재 (교목 19종, 관목 15종 등)	1,000	· 조성사업 착공(22.5.) · 조성사업 준공예정(22.12.)	10
금왕 용담산 근린공원 조성사업	· 산책로, 광장,주민 체육시설, 교목식재 등 도시공원 조성	10,050	· 근린공원 조성사업(1차) 준공(21. 12.) · 보완시설설계용역 완료(22. 3.) · 근린공원 조성사업(2차) 착공(22.4.) · 시공감리용역 시행(22. 5.) · 근린공원 조성사업 전기공사 착공(22. 5)	60
대소 망가래 근린공원 조성사업	· 산책로, 광장,주민 체육시설, 교목식재 등 도시공원 조성	3,395	· 실시설계용역 완료(21. 9.) · 근린공원 조성사업 착공(21. 4.)	60

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
용계저수지 둘레길 조성사업	둘레길 400m조성	500	· 용계저수지 둘레길 계약 완료	10
무궁화 동산 조성사업	· 감우재 전승기념관 주변 무궁화 동산 조성	100	· 무궁화동산 조성사업 실시설계(시공감리) 용역 시행(22.01.) · 무궁화동산 조성사업 실시설계 완료(22.03.) · 무궁화동산 조성사업 착공(22.06.)	50
녹색자금 지원사업	· 수목식재(교목 및 관목 13종), 편의 시설(안내판, 휴게쉼터) 등 조성	200	· 음성 향애원 내 복지시설 나눔숲 조성사업 착공(22.04.~10.)	20
사정저수지 경관조성사업	· 수목식재(교목 및 관목), 편의시설(포토존, 쉼터조성) 등	100	· 실시설계용역 완료(22. 3.) · 경관조성사업 착공(22. 4.)	60
쾌적한 도시경관 조성 사업	· 꽃묘장 운영 · 꽃길·꽃밭 조성 · 가로수 조성 및 관리 · 도시림 유지관리사업 302,311㎡(총 14개소)	2,041	· 봄·여름 꽃묘 생산 및 배부(22. 3 ~ 7.) · 가을 꽃묘 생산 중(22. 1. ~ 12.) · 가로수 조성사업 시행 완료(22. 4.) · 도시림 유지관리 시행(1회)(22.5.)	40
도시공원 및 녹지대 유지관리 사업	· 도시공원 및 녹지 수목예초·제초·전정 등 유지관리	859	· 예초 3회·제초3회·전정 1회 등 유지관리(5월/7월/8월)	30
수레의산 자연휴양림 보완사업	· 사면 및 계류 등 보완공사	1,000	· 1차 실시설계용역 준공(22. 4.) · 일상감사 및 도계약심사 실시(22. 5.) · 1차 공사 실시(22. 6. ~ 11.)	15
맹동 치유의 숲 조성사업	· 산림치유문화센터, 치유정원, 치유숲길 조성	5,000	· 타당성 평가 용역 시행(20. 8.) · 산림치유센터 공공건축심의(20.12.) · 소규모환경영향평가 준공(22. 5.) · 조성공사 착공(22. 11.)	20
백야자연휴양림 보완사업	· 건축물 2동(회의시설 1동/숙박시설 1동) 건립	5,800	· 건축설계공모 실시(21. 5.) · 건축인허가 협의 완료(22. 4.) · 설계안전성검토 완료(22. 5.)	30
금봉산 탐방로 조성사업	· 탐방로(L=3.052km), 쉼터, 전망대, 구름다리 등 조성	1,000	· 숲길 타당성 평가 완료(21. 10.) · 실시설계 용역 완료(21. 10.) · 숲길 노선 지정 고시(21. 12.) · 공사 착공(22. 1.)	30

III. 2022년도 군정 주요 현안 사업

1. 선도 산림경영단지 조성사업

- ◆ 위 치: 감곡면 월정리 산97번지 외 194필지
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2031.(10년간)
- ◆ 규 모: 816ha
- ◆ 총사업비: 7,500백만원 (국비 4,500, 도비 900, 군비 2,100)
- ◆ 사업내용: 단지 내 조림, 숲가꾸기, 임도, 특화임산물 재배단지 조성 등 산림경영에 필요한 산림사업
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2031. 12.

□ 추진상황

- 음성군-음성군산림조합 계약 및 MOU 체결 22. 2.
- 산림기본계획수립 용역 착수 22. 3.
- 운영협의체 구성 및 제1회 협의회 개최 22. 4.
- 산림경영계획수립 용역 착수 22. 6.

□ 향후계획

- 제2회 운영협의회 개최 22. 8.
- 숲가꾸기 시행 22. 9.
- 산림기본계획수립 용역 완료 22. 11.
- 제3회 운영협의회 개최 22. 12.
- 숲가꾸기 및 산림경영계획수립 완료 22. 12.

□ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	7,500	-	500	780	6,220
국 비	4,500	-	300	468	3,732
도 비	900	-	60	94	746
군 비	2,100	-	140	218	1,742
민 간		-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 / 산림정책팀	담당자	녹지9급 정아영	전화번호	871-3745
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현황도

□ 위치도

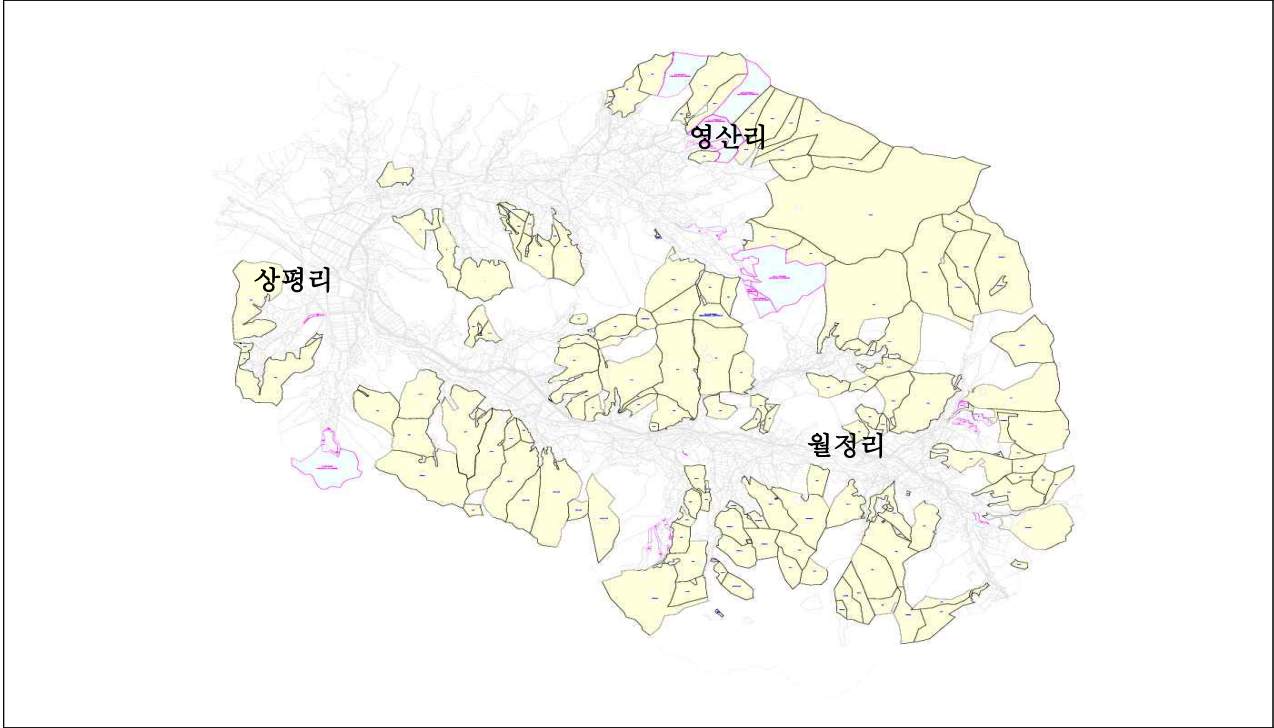

□ 현황도



2. 봉학골 지방정원 조성사업

- ◆ 위치: 음성군 음성읍 용산리 580-8번지 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2023.
- ◆ 규모: 36.3ha
- ◆ 총사업비: 10,500백만원 (도비 3,900, 군비 6,600)
- ◆ 사업내용: 방문객센터, 주차장, 주제정원(11개), 가드너 교육센터 조성 등
- ◆ 공정률(이행률): 50% ◆ 완료시기: 2023. 12.

필요성

- 봉학골 산림욕장 일원의 지방정원 조성으로 중부권 내 정원문화 확산의 거점시설 확보를 통한 지역발전 및 관광인프라 구축

추진상황

- 봉학골 지방정원 조성공사(1차) 준공 21. 5.
- 봉학골 지방정원 조성공사(2차) 착공 21. 6.
- 협의불가 사유지 매입 21. 12.
- 봉학골 지방정원 조성공사(2차) 준공 22. 6.

향후계획

- 봉학골 지방정원 조성공사(총차) 준공 23. 5.

투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합계	10,500	7,872	2,628	-	-
국비	-	-	-	-	-
도비	3,900	2,842	1,058	-	-
군비	6,600	5,030	1,570	-	-
민간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지6급 안치훈	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도

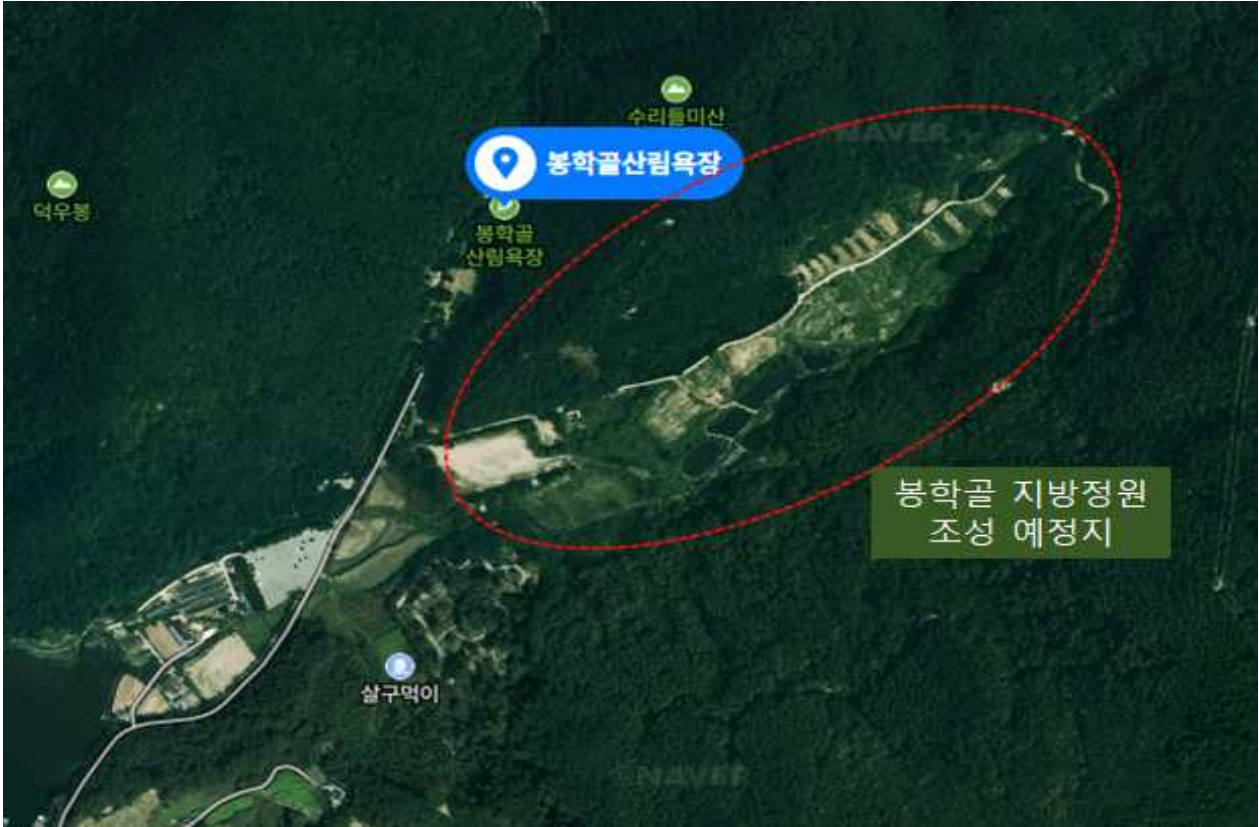

□ 조감도



3. 봉학골 산림레포츠단지 조성사업

- ◆ 위 치: 음성읍 용산리 580-8번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 규 모: 15.0ha
- ◆ 총사업비: 5,800백만원 (도비 3,770, 군비 2,030)
- ◆ 사업내용: 모험·체험시설 4종 산림레포츠시설, 순환산책로 및 휴게시설
- ◆ 공정률(이행률): 5% ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 필 요 성

- 봉학골 산림욕장, 봉학골 지방정원 등과 연계한 체험코스 및 관광자원 개발로 지역발전과 경제 활성화 기대

□ 추진상황

- 봉학골 산림레포츠단지 기본계획수립 용역 21. 7.
- 봉학골 산림레포츠단지 사업 신청 21. 7.
- 봉학골 산림레포츠단지 사업 선정 21. 11.

□ 향후계획

- 봉학골 산림레포츠단지 기본설계용역 준공 22. 11.
- 봉학골 산림레포츠단지 실시설계용역 실시 22. 11.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	5,800	-	300	2,000	3,500
국 비	-	-	-	-	-
도 비	3,770	-	195	1,300	2,275
군 비	2,030	-	105	700	1,225
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지6급 안치훈	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



□ 현장사진



4. 미세먼지 차단숲 조성사업

- ◆ 위 치: 원남면 상노리 772번지(원남일반산업단지) 일원
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2022.
- ◆ 규 모: 1.0ha
- ◆ 총사업비: 1,000백만원 (국비 500, 도비 150, 군비 350)
- ◆ 사업내용:수목식재(교목 19종, 관목 15종, 초화류 식재)
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 필 요 성

- 산업단지 등으로 발생하는 미세먼지 및 대기오염원 저감을 위한 도시숲 조성으로 기후변화 대응방안마련 및 정주여건 개선

□ 추진상황

- 대상지 선정 21. 9.
- 현황측량 및 실시설계용역 22. 4.
- 미세먼지 차단숲 조성사업 착공 22. 5.

□ 향후계획

- 2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 준공 22. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	1,000	-	1,000	-	-
국 비	500	-	500	-	-
도 비	150	-	150	-	-
군 비	1350	-	1350	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지6급 안치훈	전화번호	871-3752
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



5. 금왕 용담산 근린공원 조성사업

- ◆ 위 치: 금왕읍 무극리 286-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2017. ~ 2022.
- ◆ 규 모: 공원조성 45,100m²
- ◆ 총사업비: 10,050백만원 (군비100%)
- ◆ 사업내용: 산책로, 광장 ,주민 체육시설, 교목식재 등 도시공원 조성
- ◆ 공정률(이행률): 60% ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 필 요 성

- 도시공원 장기미집행시설 해소로 주민의 사유재산권 보호
- 주민 여가선용 및 휴식공간 지역주민에게 제공

□ 추진상황

- 공원조성사업(1차분) 착공 및 준공 21 .6. ~ 12.
- 보완설시설계 용역 착수 및 준공 22. 1. ~ 3.
- 공원조성사업(2차분) 착공 22. 4.
- 공원조성사업 전기공사 착공 22. 5.

□ 향후계획

- 공원조성사업 전기공사 준공 22. 12.
- 공원조성사업 준공 22. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	10,050	6,050	4,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	10,050	6,050	4,000	-	-
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	시설9급 정수진	전화번호	871-3755
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



6. 대소 망가래 근린공원 조성사업

- ◆ 위 치: 대소면 태생리 399-2번지 일원
- ◆ 사업기간: 2017. ~ 2022.
- ◆ 규 모: 공원조성 31,716㎡
- ◆ 총사업비: 3,395백만원 (군비 3,395)
- ◆ 사업내용: 산책로, 광장, 주민 체육시설, 교목식재 등 도시공원 조성
- ◆ 공정률(이행률): 60 % ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 필 요 성

- 도시공원 장기미집행시설 해소로 주민의 사유재산권 보호
- 편안한 휴식과 쾌적한 공원환경을 지역주민에게 제공

□ 추진상황

- 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 준공 21. 9.
- 공원조성사업 착공 22. 4.
- 공원조성사업 전기공사 착공 22. 6.

□ 향후계획

- 공원조성사업 전기공사 준공 22. 11.
- 공원조성사업 준공 22. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	3,395	2,645	750	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,395	2,645	750	-	-
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	시설9급 정수진	전화번호	871-3755
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



7. 용계저수지 둘레길 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 용계저수지 일원
- ◆ 사업기간: 2022.01.~2022.12.
- ◆ 규 모: 둘레길 1식
- ◆ 사 업 비: 5억원(군비 100%)
 - ※ 용계저수지 둘레길 2.2km 완료(명품가로숲길, 등산로 정비 포함)(17억),
2022년 400m구간 조성예정(5억), 2023년 잔여구간 750m완료예정(10억)
- ◆ 사업내용: 둘레길 400m
- ◆ 공정률(이행률): 10% ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 필 요 성

- 용계저수지가 가진 수변경관 및 산림경관 등 다양한 자원을 활용한 산책코스 마련으로 다양한 계층의 여가공간 및 휴게 및 학습·체험 활동 공간을 확보하여 주민들의 여가활동 욕구 해소

□ 추진상황

- 용계저수지 둘레길 조성사업 실시설계용역 준공 22. 03.
- 용계저수지 둘레길 조성사업 착공 22. 07.

□ 향후계획

- 용계저수지 둘레길 조성사업 준공 22. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	3,200	1,700	500	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	100	100	-	-	-
군 비	3,100	1,600	500	1,000	-
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지7급 안종민	전화번호	871-3753
------	---------------	-----	----------	------	----------

□ 위치도



□ 현장사진



8. 무궁화 동산 조성사업

- ◆ 위 치: 음성읍 소여리 897번지 일원(감우재 전승기념관 주변)
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 8.
- ◆ 규 모: 5,100㎡
- ◆ 총사업비: 100백만원 (국비 50, 도비 15, 군비 35)
- ◆ 사업내용: 무궁화 약 500본(화합,송암) 식재 및 회양목 등 5종 식재
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2022. 10.

□ 필요성

- 생활 속 무궁화 보급을 통한 나라꽃 무궁화에 대한 관심과 위상 제고
- 전승기념관의 충혼탑 및 전승비와 조화로운 나라꽃 무궁화 동산 조성을 통한 관광지 조성

□ 추진상황

- 무궁화동산 조성사업 실시설계(시공감리) 용역 시행 22. 1.
- 무궁화동산 조성사업 실시설계 완료 22. 3.
- 무궁화동산 조성사업 착공 22. 6.

□ 향후계획

- 무궁화동산 조성사업 준공 22. 8.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	100	-	100	-	-
국 비	50	-	50	-	-
도 비	15	-	15	-	-
군 비	35	-	35	-	-
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 녹지공원팀	담당자	녹지9급 반연화	전화번호	871-8756
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



□ 현장사진



9. 복지시설나눔숲 조성사업(녹색자금 지원사업)

- ◆ 위 치: 음성읍 읍내리 716-12번지 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 10.
- ◆ 규 모: 나눔숲 A=1,800㎡
- ◆ 총사업비: 200백만원 (국비 200)
- ◆ 사업내용: 수목식재(교목 및 관목 13종), 편의 시설(안내판, 휴게쉼터) 등
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2022. 10.

□ 추진상황

- 복지시설나눔숲 조성사업 시공감리용역 착공 22. 2.
- 복지시설나눔숲 조성사업 착공 22. 4.

□ 향후계획

- 복지시설 나눔숲 조성사업 준공 22. 10.
- 복지시설 나눔숲 조성사업 시공감리 용역 준공 22. 10.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	200	-	200	-	-
국 비	200	-	200	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지8급 손두표	전화번호	871-3754
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



□ 현장사진



위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 현장 사진



11. 쾌적한 도시경관 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- ◆ 규 모: 꽃묘생산: 70만본, 꽃밭조성: 6개소 10ha,
꽃길조성: 7종 60km(꽃씨파종), 70개소 / 96,990㎡(화분, 화단)
가로수 조성: 2개소 7km / 가로수 관리 789본
도시경관 조성지 유지관리: 14개소 / 302,311㎡
- ◆ 사 업 비: 2,041백만원(도비5, 군비95)
- ◆ 사업내용: 쾌적한 녹색도시경관을 위한 꽃길·꽃밭 조성, 가로수
조성·관리, 도시경관 조성지 유지관리
- ◆ 공정률(이행률): 40% ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 필 요 성

- 쾌적한 녹색도시경관 조성을 통한 아름다운 음성군 이미지 제고

□ 추진상황

- 꽃묘장 운영(꽃묘생산분배) 및 꽃길·꽃밭 조성 추진 22. 1. ~ 12.
- 가로수 조성사업 완료(맹동,대소,삼성) 22. 3. ~ 4.
- 도시림 유지관리 사업 추진(1회) 22. 5.

□ 향후계획

- 꽃묘장 운영(꽃묘생산분배) 및 꽃길·꽃밭 조성 추진 22. 1. ~ 12.
- 가로수 민원 및 유지관리 추진 22. 1. ~ 12.
- 가로수 보식작업 시행 22. 9. ~10.
- 도시림 유지관리 사업 추진(2회) 22. 7.
- 도시림 유지관리 사업 추진(3회) 22. 9.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	4,082	-	2,041	2,041	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	224	-	112	112	-
군 비	3,858	-	1,929	1,929	-
기 타	-	-	-	-	-

부서/팀	산림복지과 / 녹지공원팀	담당자	시설9급 정수진	전화번호	871-3755
------	---------------	-----	----------	------	----------

현장사진

□ 현장 사진



12. 도시공원 및 녹지대 유지관리 사업

- ◆ 위 치: 음성군 일원
- ◆ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- ◆ 규 모: 36개소 972,669㎡, 녹지 341,687㎡
- ◆ 사 업 비: 859백만원 (군비 100%)
- ◆ 사업내용: 도시공원 및 녹지 수목 예초·제초·전정 등 유지관리
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2022. 9.

필 요 성

- 도시공원 유지관리를 통한 아름다운 음성군 이미지 제고

추진상황

- 도시공원 및 녹지대 유지관리 사업 추진 (1회) 22. 5.

향후계획

- 도시공원 및 녹지대 유지관리 사업 추진 (2회) 22. 7.
- 도시공원 및 녹지대 유지관리 사업 추진 (3회) 22. 8.

투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	1,859	-	859	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,859	-	859	1,000	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 녹지공원팀	담당자	녹지8급 손두표	전화번호	871-3754
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도

□ 위치도

18개소	합계	302,415㎡	공용면적
근린공원 6개소	계	244,976㎡	
근린공원 1호		11,931㎡	농림공원
근린공원 2호		28,548㎡	실기농원공원
근린공원 3호		23,986㎡	선홍공원
근린공원 4호		22,777㎡	향남공원
근린공원 6호		99,438㎡	동말공원
근린공원 11호		28,306㎡	남천공원
소공원 6개소	계	21,236㎡	
소공원 1호		4,026㎡	봉천리공원
소공원 2호		4,935㎡	명말공원
소공원 3호		8,257㎡	산토리공원
소공원 4호		550㎡	해죽공원
소공원 5호		414㎡	호조기공원
소공원 7호		3,074㎡	도라성공원
어린이공원 5개소	계	12,426㎡	
어린이공원 1호		3,288㎡	무촌나들공원
어린이공원 2호		1,829㎡	마루공원
어린이공원 3호		3,155㎡	가운들공원
어린이공원 4호		1,696㎡	아름공원
어린이공원 5호		2,658㎡	아름드리공원
주변공원 1개소	계	83,257㎡	
주변공원 1호		83,257㎡	동말공원

합계	357,538㎡
완충녹지	83,607㎡
경관녹지	196,714㎡
연명녹지	87,217㎡



13. 맹동 치유의 숲 조성사업

- ◆ 위 치: 맹동면 군자리 산46번지 일원
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 60.0ha
- ◆ 총사업비: 5,000백만원 (도비 3,250, 군비 1,750)
- ◆ 사업내용: 산림치유문화센터, 치유정원, 치유숲길 조성
- ◆ 공정률(이행률): 20% ◆ 완료시기: 2023. 12.

□ 추진상황

- 타당성 평가 용역 시행 20. 8.
- 소규모환경영향평가 시행 20. 10.
- 산림치유문화센터 공공건축심의 20. 12.
- 소규모환경영향평가 준공 22. 5.

□ 향후계획

- 실시설계용역 준공 22. 10.
- 일상감사 및 도 계약심시 실시 22. 11.
- 치유의 숲 조성공사 착공 22. 11. ~ 23. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	5,000	800	420	3,780	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	3,250	520	273	2,457	-
군 비	1,750	280	147	1,323	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과 / 산림휴양팀	담당자	녹지6급 노홍래	전화번호	871-3762
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



14. 백야자연휴양림 보완사업

- ◆ 위 치: 금왕읍 백야리 150번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 건축물 2동(숙박시설/회의시설) 건립
- ◆ 총사업비: 5,800백만원 (균특 2,900, 도비 1,450, 군비 1,450)
- ◆ 사업내용: 기업체 등 단체로 이용가능한 회의시설 및 사회적 약자를 배려한 숙박시설 마련
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2023. 12.

□ 추진상황

- 공공건축 사업계획 사전검토 완료 21. 2.
- 공공건축심의위원회 건축기획 심의 완료 21. 4.
- 건축설계공모 실시 21. 5. ~ 7.
- 실시설계용역 실시 21. 8.
- 설계안전성검토 및 안전보건대장 작성 용역 실시 22. 3.
- 공용건축물 건축인허가 협의 완료 22. 4.
- 국토안전관리원 설계안전성검토 완료 22. 5.

□ 향후계획

- BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 22. 6.
- 자연휴양림(변경) 조성계획 승인 22. 6.
- 공사 착공 및 준공 22. 7. ~ 23. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	5,800	400	2,000	3,400	-
균 특	2,900	200	1,000	1,700	-
도 비	1,450	100	500	850	-
군 비	1,450	100	500	850	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과/산림휴양팀	담당자	행정8급 안진현	전화번호	871-3763
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



15. 금봉산 탐방로 조성사업

- ◆ 위 치: 소이면 갑산리 30-1번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2022.
- ◆ 규 모: 탐방로 조성 1식
- ◆ 총사업비: 1,000백만원 (도비 650, 군비 350)
- ◆ 사업내용: 탐방로(L=3.052km), 쉼터, 전망대, 구름다리 등 조성
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2022. 12.

□ 추진상황

- 숲길조성계획 수립 21. 2.
- 실시설계용역 시행 21. 2. ~ 10.
- 금봉산 탐방로 타당성 평가용역 시행 21. 8. ~ 10.
- 주민설명회 개최 21. 10.
- 숲길 노선 지정 고시 21. 12.
- 탐방로 조성사업 시행 22. 1. ~ 12.

□ 향후계획

- 탐방로 조성공사 준공 22. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	1,000	200	800	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	650	130	520	-	-
군 비	350	70	280	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	산림녹지과/산림휴양팀	담당자	녹지6급 노홍래	전화번호	871-3762
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 노선도

